អគ្គិសនីកម្ពុជា
នាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

របាយការណ៍
ស្តីពី
សកម្មភាពការងាររបស់
នាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ
ឆ្នាំ២០១៣

រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

ឆ្នាំ២០១៤

អារម្ភកថា

របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ឆ្នាំ២០១៣ ចេញផ្សាយឆ្នាំ២០១៤ ជារបាយការណ៍ដែលរៀបចំប្រមូលផ្តុំនូវព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ គោលនយោបាយស្តីពីថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ការបង្កើតមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ បេសកកម្ម សកម្មភាព និងសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទរបស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទបានអនុវត្តកន្លងមក ពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ (ពេលមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា) រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣។ របាយការណ៍នេះ មានគោលបំណងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកវិនិយោគ និងសាធារណជនដែលមានបំណងចង់ដឹងពីសកម្មភាពការងាររបស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូប-នីយកម្មជនបទក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

របាយការណ៍នេះ បានរៀបចំឡើងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។

មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ មានផែនការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសមិទ្ធិផលការងាររបស់ខ្លួន ១ឆ្នាំម្តង ដើម្បីឲ្យទិន្នន័យ និងព័ត៌មាននានាស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទឆ្លុះបញ្ចាំងទាន់សភាពការណ៍វិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង។ មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទនឹងរង់ចាំដោយក្តីសោមនស្សនូវរាល់សំណូមពរ និងមតិយោបល់របស់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកវិនិយោគ និងសាធារណជន ដើម្បី ធ្វើឲ្យរបាយការណ៍នេះកាន់តែមានសារៈប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃអនាគត។

មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទសង្ឃឹមថា របាយការណ៍នេះ ជាឯកសារមានតម្លៃមួយសម្រាប់ជាព័ត៌-មានស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ។

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា

កែវ-រតនៈ

មាតិកា

ទំព័រ

ជំពូកទី១ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងគោលនយោបាយស្តីពីថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ៦

១.១ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ៦
១.២ គោលនយោបាយស្តីពីថាមពលកកើតឡើងវិញ ៦

ជំពូកទី២ ព័ត៌មានស្តីពីមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ៨

២.១ ការបង្កើតមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ៨
២.២ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ ម.អ.ជ. ៨
២.៣ អាសយដ្ឋានរបស់ ម.អ.ជ. ៨
២.៤ ប្រភពមូលនិធិរបស់ ម.អ.ជ. ១០

ជំពូកទី៣ ព័ត៌មានស្តីពីគោលបំណង បេសកកម្ម និងកម្មវិធីរបស់ ម.អ.ជ. សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ១១

៣.១ គោលបំណងរបស់ ម.អ.ជ. ១១
៣.២ បេសកកម្មរបស់ ម.អ.ជ. ១១
៣.៣ កម្មវិធីរបស់ ម.អ.ជ. សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ១១
៣.៣.១ កម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ១១
៣.៣.២ កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ១២
៣.៣.៣ កម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ១២
៣.៤ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ ម.អ.ជ. ១៣
៣.៤.១ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ១៣
៣.៤.២ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ១៣
៣.៤.៣ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ១៤

ជំពូកទី៤ ព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាព / សមិទ្ធផល និងការវិភាគពីកម្មវិធីនីមួយៗដែលបានអនុវត្តដោយ ម.អ.ជ. ១៨

៤.១ កម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ១៨
៤.១.១ ចំនួនគោលដៅ និងសមិទ្ធផលក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ១៨

៤.១.២ សកម្មភាពចុះពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ២០
៤.២ កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ២១
៤.២.១ ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះចំនួន 12,000 ប្រព័ន្ធ ដែលបានផ្តល់ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន ២១
៤.២.២ កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ អានុភាព ៥០វ៉ាត់ ចំនួន 4,000 ប្រព័ន្ធ ២៣
៤.៣ កម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ២៤
៤.៣.១ ចំនួនគោលដៅ និងសមិទ្ធផល ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ២៤
៤.៣.២ សកម្មភាពចុះពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ............ ២៥
៤.៤ កម្មវិធីសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពស្ថានីយវារីអគ្គិសនីខ្នាតតូច ២៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ : ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីចុះកិច្ចសន្យា តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ២៨

ឧបសម្ព័ន្ធទី២ : ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅ គ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ .... ៣០

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ : បញ្ជីឈ្មោះភូមិគ្របដណ្តប់ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ .... ៣៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤ : ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ .... ៣៧

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥ : បញ្ជីឈ្មោះភូមិដែលបានតម្លើងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះចំនួន 12,000ប្រព័ន្ធ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន ៣៧

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦ : ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ .... ៤២

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧ : ព័ត៌មានស្តីពីអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ម.អ.ជ. ដើម្បីទទួលថវិកាជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ .... ៤៣

ឧបសម្ព័ន្ធទី៨ : ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីប្រវែងខ្សែបណ្តាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា ប្រវែងខ្សែបណ្តាញបានសាងសង់រួច និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ .... ៤៦

ឧបសម្ព័ន្ធទី៩ : បញ្ជីឈ្មោះភូមិដែលគ្របដណ្តប់ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ .... ៤៨

ឧបសម្ព័ន្ធទី១០ : ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែល ម.អ.ជ. បានផ្តល់ថវិកាទុនជួយសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ .... ៥០

បញ្ជីតារាង

ទំព័រ

តារាងទី១	:	ព័ត៌មានស្ដីពីចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅគ្រោង តភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ ជាប់កិច្ចសន្យាចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ ចំនួនគ្រួសារគោលដៅគ្រោងភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីមិនបានសម្រេចនិងត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ក្រោមកម្មវិធីផ្ដល់ចរន្ត អគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣	១៨
តារាងទី២	:	ចំនួនភូមិសរុបនិងចំនួនភូមិ តាមខេត្តនីមួយៗដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដល់ចរន្ត អគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣	១៩
តារាងទី៣	:	ព័ត៌មានស្ដីពីចំនួនប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះដែលម.អ.ជ.បានលក់និង តម្លើងដល់ គ្រួសារជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន	២១
តារាងទី៤	:	ចំនួនភូមិសរុបនិងចំនួនភូមិបានទទួលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធថាមពល ពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន	២២
តារាងទី៥	:	ព័ត៌មានសង្ខេបស្ដីពីប្រវែងខ្សែបណ្ដាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា ប្រវែង ខ្សែបណ្ដាញបានសាងសង់រួច ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣	២៤
តារាងទី៦	:	ចំនួនភូមិសរុបនិងចំនួនភូមិបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមកម្មវិធីជួយ ទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣	២៥

ជំពូកទី១
យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និង គោលនយោបាយស្តីពីថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

១.១ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ភាពចាំបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាល។ ការបង្ករលក្ខណៈឲ្យទទួលបាននូវសេវាកម្មអគ្គិសនីដែល ទុកចិត្តបាននៅតំបន់ជនបទក្នុងថ្លៃដែលអាចទទួលយកបាន គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរបៀបវារៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពសង្គម។

អនុវត្តតាមរបៀបវារៈខាងលើ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ដែលជាក្រសួងជំនាញបានដាក់ចេញនូវគោលដៅចំនួន ២ដំណាក់កាល សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទដូចខាងក្រោម៖

១. ដល់ឆ្នាំ២០២០ភូមិទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ពីប្រភពផ្សេងៗ
២. ដល់ឆ្នាំ២០៣០ យ៉ាងហោច ៧០% នៃគ្រួសារទាំងអស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពដូចអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិប្រើប្រាស់។

ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលបានដាក់ចេញខាងលើ រួមមាន ១- អគ្គិសនីកម្ពុជាទទួលរ៉ាប់រងខិតខំពង្រីកវិសាលភាពប្រព័ន្ធបញ្ជូនមេតង់ស្យុងខ្ពស់ (HV) ទៅគ្របដណ្តប់លើខេត្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅៗ និងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់តង់ស្យុងមធ្យម (MV) ទៅគ្របដណ្តប់តំបន់ជនបទឲ្យបានកាន់តែឆ្ងាយទៅៗ ២- ពង្រីកតំបន់ផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគ្របដណ្តប់តំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលឲ្យកាន់តែច្រើនទៅៗ និង ៣- ផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលរួមវិនិយោគលើវិស័យអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់ថ្មីៗ ដែលពុំទាន់មានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅឡើយ។

១.២ គោលនយោបាយស្តីពីថាមពលកកើតឡើងវិញ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទដោយប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញចំនួន ៦ចំណុច[1] ដូចខាងក្រោម៖

១. ខិតខំខ្នះខ្នែងផ្តល់សេវាអគ្គិសនីដែលទុកចិត្តបាន មានសុវត្ថិភាព មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានតិចតួចដល់បរិស្ថាន និងតាមថ្លៃដែលអាចទទួលយកបានដល់សម្រាប់សហគមន៍ជនបទ។
២. ផ្តល់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានប្រសិទ្ធភាព ការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ និងបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកឯកជន ដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេវាអគ្គិសនី ដោយប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញនៅជនបទ។
៣. ធ្វើសកម្មភាពជាអ្នកសម្រួលទីផ្សារតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ ឲ្យមានសមភាពក្នុងការទទួលសេវាអគ្គិសនីដែលទុកចិត្តបាន មានសុវត្ថិភាព មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានក្នុងកម្រិតតិចតួចដល់បរិស្ថាន និងតាមថ្លៃដែលអាចទទួលយកបានដល់សហគមន៍ជនបទ។

---
[1] គោលនយោបាយជាតិសម្រាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទដោយប្រើថាមពលកកើតឡើងវិញ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧។

៤. លើកទឹកចិត្តដល់ការផលិត ការបញ្ជូន និងការចែកចាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃអគ្គិសនីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ តាមរយៈការកំណត់តារាងថ្លៃលក់មួយត្រឹមត្រូវ សមស្របតាមគោលការណ៍របស់ "ច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា"។

៥. ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ដោយប្រើប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញទាំងឡាយណាដែលមានថ្លៃ ថោកជាងគេសម្រាប់សហគមន៍នៅតំបន់ជនបទ តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ សាកល្បង និងការអភិវឌ្ឍន៍គំរូ ជាផ្នែកមួយនៃភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធបណ្តាញនិងប្រព័ន្ធទោល។

៦. ជានាឲ្យមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ យន្តការស្ថាប័នសមស្រប និងការបណ្តុះបណ្តាលនានា ដើម្បីអ្នកក្រីក្រមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ។

ជំពូកទី២
ព័ត៌មានស្តីពីមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

២.១ ការបង្កើតមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ។ ក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួន មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទបានប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានផ្តល់ដោយធនាគារពិភពលោក ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន និងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ បន្ទាប់ពីគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុពុំផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ដំណើរការស្ថាប័ននេះ បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យថ្មីមួយទៀតលេខ នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ ដោយធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាខ្លះនៃព្រះរាជក្រឹត្យចាស់ ដោយផ្ទេរស្ថាប័នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាវិញ ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងអាចម្ចាស់ការបន្តប្រតិបត្តិការការងាររបស់មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទផង និងក៏នៅតែអាចទទួលនូវអំណោយនិងជំនួយនានាពីខាងក្រៅមកជួយអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទកម្ពុជាបានផង។ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យថ្មីនេះ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានបង្កើតនាយកដ្ឋានថ្មី[2] មួយ ហៅថា **"នាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ"** បន្ទាប់ពីនេះហៅថា **"ម.អ.ជ."**។

នេះជាជំហានដ៏ធំមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទដែលនឹងទាក់ទាញ និងលើកទឹកចិត្តផ្នែកឯកជនឲ្យចូលរួមវិនិយោគក្នុងការធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ដើម្បីជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនបទ និងដើម្បីអាចផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទកាន់តែច្រើនគ្រួសារមានអគ្គិសនីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់បំភ្លឺ ប្រកបរបរអាជីវកម្ម សិប្បកម្ម និងប្រើជាផលប្រយោជន៍ដទៃទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទូទៅដល់សង្គមជាតិ។

២.២ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ ម.អ.ជ.

ម.អ.ជ. ប្រតិបត្តិការស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងមានលក្ខណៈសង្គមកិច្ច និងមានគណនីដាច់ដោយឡែក។

២.៣ អាសយដ្ឋានរបស់ ម.អ.ជ.

អាសយដ្ឋាន ម.អ.ជ. ស្ថិតនៅអាគារលេខ២០៥ ផ្លូវជាតិលេខ៥ សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ៦ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។ គេហទំព័ររបស់ ម.អ.ជ. គឺ www.ref.gov.kh ។

[2] សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨៩៨សសអក.រប ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការកំណត់ថ្នាក់អង្គភាពមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទក្នុងអង្គការលេខ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីកម្ពុជា។

ម.អ.ជ. ក៏មានបណ្ណាល័យសម្រាប់សាធារណជន ដែលមានបំណងចង់យល់ដឹងពីកម្មវិធីរបស់ ម.អ.ជ. របាយការណ៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

២.៤ ប្រភពមូលនិធិរបស់ ម.អ.ជ.

ប្រភពមូលនិធិដល់ ម.អ.ជ. មានដូចខាងក្រោម៖

១. កញ្ចប់ថវិកាសង្គមកិច្ចដែលបានគ្រោងក្នុងបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងអំណោយដទៃទៀតរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រសិនបើមាន។

២. អំណោយ និងជំនួយឥតសំណងដែលប្រភព និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ត្រូវបានទទួលការឯកភាពពីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

៣. ថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

បច្ចុប្បន្ន ថវិការបស់ ម.អ.ជ. បានមកពីអគ្គិសនីកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាចំនួន ៤លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ ម.អ.ជ. និងអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទចំនួន៣ រួមមាន៖ ១-កម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ ២-កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ និង៣-កម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ។

ជំពូកទី៣
ព័ត៌មានស្តីពីគោលបំណង បេសកកម្ម និងកម្មវិធីរបស់ ម.អ.ជ. សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

៣.១ គោលបំណងរបស់ ម.អ.ជ.

គោលបំណងរបស់ ម.អ.ជ.[3] មានដូចខាងក្រោម៖

១. ជំរុញឲ្យមានសមធម៌ក្នុងការទទួលសេវាកម្មអគ្គិសនី ដោយជួយឲ្យប្រជាជននៅជនបទបានទទួលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមថ្លៃ ដែលអាចជាវបានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងលំនៅដ្ឋាន រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

២. ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តផ្នែកឯកជនឲ្យចូលរួមវិនិយោគធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ប្រកបដោយចីរភាព ជាពិសេសក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងថាមពលកកើតឡើងវិញ ដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងពាណិជ្ជកម្មសមស្រប។

៣.២ បេសកកម្មរបស់ ម.អ.ជ.

ម.អ.ជ. មានបេសកកម្ម ដូចខាងក្រោម៖

១. ជម្រុញវិសាលភាពអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទប្រកបដោយសមភាព ដោយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនបទទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងគ្រួសារ។

២. ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការរៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ។

៣. ផ្តល់ការគាំទ្រ និងជួយសម្រួលដល់គ្រួសារក្រីក្ររស់នៅតំបន់ជនបទ អាចទទួលបានការតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដោយការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអនុគ្រោះគ្មានការប្រាក់។

៤. ផ្តល់ការគាំទ្រ និងជួយសម្រួលឲ្យគ្រួសារជនបទរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីមិនទាន់អាចពង្រីកទៅដល់ក្នុងរយៈពេលយូរអាចទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ។

៥. ផ្តល់ការគាំទ្រ និងជួយសម្រួលឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឯកជននៅតំបន់ជនបទ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ អាចមានទុនសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យពេញដែនអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារអាចភ្ជាប់ចរន្តប្រើប្រាស់តាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន។

៦. ជម្រុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងពាណិជ្ជកម្ម។

៣.៣ កម្មវិធីរបស់ ម.អ.ជ. សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ

បច្ចុប្បន្ន ម.អ.ជ. កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

៣.៣.១ កម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ

គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ គឺជួយដល់គ្រួសារក្រីក្ររស់នៅតំបន់ជនបទ ដើម្បីឲ្យគ្រួសារក្រីក្រ

[3] មាត្រា៣ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការបង្កើតស្ថាប័ន ម.អ.ជ.។

រស់នៅតំបន់ជនបទអាចទទួលបានការតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដោយការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអនុគ្រោះគ្មានការប្រាក់ឲ្យគ្រួសារជនបទខ្ចីយកទៅ៖ ១- បង់ថ្លៃភ្ជាប់ចរន្តឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ២- បង់ថ្លៃប្រាក់កក់ឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៣- ចំណាយលើការទិញ និងរាយខ្សែពីចំណុចភ្ជាប់ចរន្តមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួន និង៤- ចំណាយលើការរៀបចំខ្សែបណ្តាញ និងឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ ដើម្បីតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីចូលផ្ទះ។ ប្រាក់កម្ចីនេះនឹងទូទាត់តាមរយៈអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់សងត្រឡប់មក ម.អ.ជ. វិញ ដោយបានមកពីការប្រមូលពីអ្នកខ្ចីដែលត្រូវបង់សងរំលស់១ខែម្តង មក ម.អ.ជ. ក្នុងរយៈកំណត់មួយ។ ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីអនុគ្រោះនេះ គឺមិនលើសពី 480,000 រៀល ក្នុង១គ្រួសារ។

៣.៣.២ កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ

គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ គឺជួយសម្រួលឲ្យគ្រួសារជនបទរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល ដែលខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីមិនទាន់អាចពង្រីកទៅដល់ក្នុងរយៈពេលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ។ ម.អ.ជ. នឹងជួយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនមួយផ្នែក ក្នុង១ប្រព័ន្ធដល់គ្រួសារជនបទ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការទូទាត់ថ្លៃទិញប្រព័ន្ធ ហើយអ្នកទិញត្រូវបង់ថ្លៃសល់ពីការឧបត្ថម្ភធននេះ រំលស់ប្រចាំខែដោយគ្មានការប្រាក់មក ម.អ.ជ. វិញ ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ។ ក្រោយពេលបង់រំលស់អស់ជាស្ថាពរ ប្រព័ន្ធនេះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញ។

៣.៣.៣ កម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ

គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ គឺជួយសម្រួលឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ អាចមានទុនសម្រាប់វិនិយោគពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យពេញដែនអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារអាចភ្ជាប់ចរន្តប្រើប្រាស់តាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះចែកចេញជា ៣តំបន់ ផ្អែកលើដង់ស៊ីតេប្រជាពលរដ្ឋ ដូចខាងក្រោម៖

តំបន់ទី១- តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើន ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច

ម.អ.ជ. នឹងផ្តល់ការធានាលើការខ្ចីឥណទាន ពីធនាគារក្នុងស្រុករបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ដើម្បីយកទៅវិនិយោគពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ឲ្យពេញដែនអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយរបស់ខ្លួន។

តំបន់ទី២- តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមធ្យម ដែលការធ្វើអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចពុំចំណេញ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវបង់ការប្រាក់លើដើមទុនវិនិយោគ

ម.អ.ជ. នឹងផ្តល់ថវិកាកម្ចីដោយពុំយកការប្រាក់ សម្រាប់វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ។

តំបន់ទី៣- តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួច ដែលការធ្វើអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមិនចំណេញ លុះត្រាមានការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនមួយផ្នែកលើទុនវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី

ម.អ.ជ. នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនមួយផ្នែកបន្ថែមពីលើប្រាក់កម្ចីឥតមានការប្រាក់ សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធ្វើការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ។

៣.៤ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ ម.អ.ជ.

៣.៤.១ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់សហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទ និងគ្រួសារជនបទ មានដូចខាងក្រោម៖

ក. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់សហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់សហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទ មានដូចខាងក្រោម៖

- មានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីចេញដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអាជ្ញាប័ណ្ណមានអាណត្តិយ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ។
- តំបន់ជនបទដែលមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ និងមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីយ៉ាងហោច ១ឆ្នាំហើយ។
- មានការកត់ត្រារបាយការណ៍គណនេយ្យត្រឹមត្រូវពីការធ្វើអាជីវកម្ម ដោយមានបង្ហាញពីការចំណេញពីអាជីវកម្មអគ្គិសនី។
- ទទួលខុសត្រូវប្រមូលប្រាក់បង់សងរំលស់ពីគ្រួសារជនបទ និងផ្ទេរចូលគណនីរបស់ ម.អ.ជ. តាមពេលកំណត់។
- ទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់ថវិកាដោយសារគ្រួសារជនបទពុំបង់សងមក ម.អ.ជ. វិញ លើកលែងតែមានការឯកភាពពី ម.អ.ជ. ឲ្យលុបបំណុល។
- យល់ព្រមអនុវត្តកិច្ចសន្យា៖ ១-កិច្ចសន្យាខ្ចីឥណទានអនុគ្រោះពី ម.អ.ជ. សម្រាប់ការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីប្រើប្រាស់ ២-កិច្ចសន្យារវាង ម.អ.ជ. និងសហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទានអនុគ្រោះ ៣-គោលការណ៍សម្រាប់អនុវត្ត ក្នុងការផ្តល់ឥណទានអនុគ្រោះដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទ និងឯកសារចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយ ម.អ.ជ. ក្រោមកម្មវិធីនេះ។

ខ. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់គ្រួសារជនបទ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់គ្រួសារជនបទ មានដូចខាងក្រោម៖

- រស់នៅតំបន់ជនបទដែលមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីហើយ។
- គ្រួសារពុំទាន់បានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់នៅឡើយ។
- មានលំនៅដ្ឋានឋិតថេរ និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី។
- មានលទ្ធភាពបង់សងរំលស់មកវិញប្រចាំខែ។
- យល់ព្រមបង់សងរំលស់ប្រចាំខែក្នុងរយៈពេលយូរបំផុត ៣៦ខែ។
- យល់ព្រមអនុវត្តកិច្ចសន្យា៖ ១-កិច្ចសន្យាខ្ចីឥណទានអនុគ្រោះពី ម.អ.ជ. សម្រាប់ការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីប្រើប្រាស់ ២-គោលការណ៍សម្រាប់អនុវត្តក្នុងការផ្តល់ឥណទានអនុគ្រោះដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទ និងឯកសារចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយ ម.អ.ជ. ក្រោមកម្មវិធីនេះ។

៣.៤.២ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីនេះ មានដូចខាងក្រោម៖

១. គ្រួសារជនបទ និងវត្តអារាមនៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាល ដែលខ្សែបណ្តាញមិនទាន់អាចទៅដល់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ ខាងមុខ។
២. គ្រួសារជនបទយល់ព្រមបង់សងរំលស់នៃតម្លៃសល់នៃថ្លៃប្រព័ន្ធ បន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនមក ម.អ.ជ. វិញ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ។ ការបង់ប្រាក់លើកទី១ គឺត្រូវបង់នៅថ្ងៃទទួលដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលបានតម្លើង។ វត្តអារាមយល់ព្រមបង់តម្លៃសល់នៃថ្លៃប្រព័ន្ធ បន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនទាំងអស់ដាច់តែម្តង មក ម.អ.ជ. វិញ នៅពេលប្រព័ន្ធតម្លើង។
៣. អ្នកទិញត្រូវយល់ព្រមអនុវត្តកិច្ចសន្យា និងឯកសារចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយ ម.អ.ជ។

៣.៤.៣ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះ មានដូចខាងក្រោម៖

តំបន់ទី១- តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើន ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់តំបន់ទី១ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនី ដែលមានសុពលភាពចេញដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវមានអាណត្តិយ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទខ្ចីប្រាក់។
២. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានការកត់ត្រារបាយការណ៍គណនេយ្យត្រឹមត្រូវលើការធ្វើអាជីវកម្មអគ្គិសនី។
៣. ប្រាក់កម្ចីនេះ គឺសម្រាប់តែការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជន-បទដែលភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ ឬការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធបណ្តាញទោល។
៤. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះ សម្រាប់វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យមនិងតង់ស្យុងទាបនៅក្នុងដែនអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ទាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីថ្មី និងទាំងសម្រាប់ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដែនអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន។
៥. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យា និងឯកសារផ្លូវច្បាប់នានា ជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជាសម្រាប់ការធានាលើការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ និងជាមួយធនាគារសម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់។
៦. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាលើលក្ខខណ្ឌនានាដែលខ្លួនត្រូវ អនុវត្តជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសន្យាធានាការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ រាប់ទាំងការយល់ព្រមផ្ទេរ អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុងករណីដែលខ្លួនមិនបានសងប្រាក់តាមការកំណត់។
៧. ប្រភពថវិកា គឺពីធនាគារក្នុងស្រុក។

តំបន់ទី២- តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមធ្យម ដែលការធ្វើអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចពុំចំណេញ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវបង់ការប្រាក់លើដើមទុនវិនិយោគ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់តំបន់ទី២ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនី ដែលមានសុពលភាពចេញដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវមានអាណត្តិយ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទខ្ចីប្រាក់។
២. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានការកត់ត្រារបាយការណ៍គណនេយ្យត្រឹមត្រូវលើការធ្វើអាជីវកម្មអគ្គិសនី។
៣. ថវិកានេះ សម្រាប់តែវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ដែលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិប៉ុណ្ណោះ។
៤. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះ សម្រាប់វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យមនិងតង់ស្យុងទាបនៅក្នុងដែនអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ទាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីថ្មី និងទាំងសម្រាប់ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ នៅក្នុងដែនអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន។
៥. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍រួមទាំងតម្លៃ និងត្រូវមានការឯកភាពលើការវិនិយោគពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។
៦. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីនេះពី ម.អ.ជ. ដោយមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍លម្អិត និងត្រូវផ្តល់ច្បាប់ចម្លងឯកសារវិនិយោគ ដែលទទួលបានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។
៧. ម.អ.ជ. ពិនិត្យពាក្យស្នើសុំ និងអនុម័តពីចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយសមស្របដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ និងការសងប្រាក់មកវិញ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា លើលក្ខខណ្ឌនានា ដែលខ្លួនត្រូវអនុវត្តជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់នេះ រាប់ទាំងការយល់ព្រមផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុងករណីដែលខ្លួនមិនបានសងប្រាក់តាមការកំណត់។
៨. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំមក ម.អ.ជ. ដោយមានភ្ជាប់នូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមកជាមួយ ដើម្បីស្នើសុំទូទាត់ប្រាក់កម្ចីនេះ។ ម.អ.ជ. ផ្ទៀងផ្ទាត់វឌ្ឍនភាពការងារ និងធ្វើការផ្តល់តាមដំណាក់កាលៗ ដោយផ្អែកលើវឌ្ឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. ត្រូវចេញលិខិតទទួលស្គាល់ពីចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីដែល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវិញ នៅពេលអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានបង់រំលស់សងប្រាក់កម្ចីមក ម.អ.ជ. វិញគ្រប់ចំនួន។
៩. ប្រាក់កម្ចីដែលបានផ្តល់ក្រោមយន្តការនេះ ពុំមានគិតការប្រាក់ឡើយ។
១០. ចំនួនទឹកប្រាក់ឲ្យខ្ចីនេះគឺមិនលើសពី 100,000 (មួយរយពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១គម្រោង។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចស្នើសុំអនុវត្តគម្រោងថ្មីទៀតបានពី ម.អ.ជ. ពេលចាំបាច់។
១១. ក្នុងករណី អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយ ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីនេះ គឺមិនលើសពី 50%នៃតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់របស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។ ក្នុងករណីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីថ្មី ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី គឺមិនលើសពី 50% នៃតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដែលបានស្នើសុំរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។

១២. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវយល់ព្រមអនុវត្តកិច្ចសន្យា និងឯកសារផ្លូវច្បាប់នានា ជាមួយ ម.អ.ជ.។

១៣. ប្រភពថវិកា គឺពីអគ្គិសនីកម្ពុជា។

តំបន់ទី៣- តំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួច ដែលការធ្វើអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមិនចំណេញ លុះត្រាមានការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនមួយផ្នែកលើទុនវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់តំបន់ទី៣ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនី ដែលមានសុពលភាពចេញដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវមានអាណត្តិយ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ។

២. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានការកត់ត្រារបាយការណ៍គណនេយ្យត្រឹមត្រូវលើការធ្វើអាជីវកម្មអគ្គិសនី។

៣. ប្រាក់ជំនួយនេះ សម្រាប់តែវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីតង់ស្យុងទាបនៅតំបន់ជនបទដែលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ និងត្រូវបានវាយតម្លៃដោយ ម.អ.ជ. ថាជាតំបន់អនុគ្រោះ។

៤. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី អាចវិនិយោគប្រាក់ជំនួយនេះ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីថ្មីនៅតំបន់របស់ខ្លួន។

៥. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍រួមទាំងតម្លៃ និងត្រូវទទួលការឯកភាពលើការវិនិយោគពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។

៦. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់ជំនួយ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនពី ម.អ.ជ. ដោយមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍លម្អិត និងត្រូវផ្តល់ច្បាប់ចម្លងឯកសារវិនិយោគដែលមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ព្រមទាំងបង្ហាញភ័ស្តុតាងសម្រាប់ការអនុម័តលើយន្តការ និងចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភធន។

៧. ម.អ.ជ.ពិនិត្យពាក្យស្នើសុំនិងអនុម័តពីចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនសមស្របដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ និងការសងប្រាក់មកវិញ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាលើលក្ខខណ្ឌនានា ដែលខ្លួនត្រូវអនុវត្តជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជំនួយនេះ រាប់ទាំងការយល់ព្រមផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុងករណីដែលខ្លួនមិនបានសងប្រាក់តាមការកំណត់។

៨. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំមក ម.អ.ជ. ដោយមានភ្ជាប់នូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមកជាមួយ ដើម្បីស្នើសុំទូទាត់ប្រាក់ជំនួយ។ ម.អ.ជ. ផ្ទៀងផ្ទាត់វឌ្ឍនភាពការងារ និងធ្វើការទូទាត់តាមដំណាក់កាលៗ ដោយផ្អែកលើវឌ្ឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. ត្រូវចេញលិខិតទទួលស្គាល់ពីចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីដែល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវិញ នៅពេលអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានបង់រំលស់សងប្រាក់កម្ចីមក ម.អ.ជ. វិញគ្រប់ចំនួន។ ទឹកប្រាក់ដែល ម.អ.ជ. បានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រាក់ជំនួយនេះ មិនតម្រូវឲ្យសងវិញទេ។

៩. ប្រាក់កម្ចីដែលបានផ្តល់ក្រោមយន្តការនេះ ពុំមានគិតការប្រាក់ឡើយ។

១០. ចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយសរុប គិតទាំងប្រាក់កម្ចី និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភធន មិនលើសពី 100,000 (មួយរយពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង១គម្រោង។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចស្នើសុំអនុវត្តគម្រោងថ្មីទៀតបានពី ម.អ.ជ. ពេលចាំបាច់។

១១. ក្នុងករណីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយ ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភធន គឺមិនលើសពី 30% នៃតម្លៃគម្រោង និងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី គឺមិនលើសពី 50% នៃតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់របស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។ ក្នុងករណីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីថ្មី ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភធន គឺមិនលើសពី 30% នៃតម្លៃគម្រោង និងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី គឺមិនលើសពី 50% នៃតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដែលបានស្នើសុំរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។

១២. អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីត្រូវយល់ព្រមអនុវត្តកិច្ចសន្យា និងឯកសារផ្លូវច្បាប់នានា ជាមួយ ម.អ.ជ.។

១៣. ប្រភពថវិកា គឺពីអគ្គិសនីកម្ពុជា។

ជំពូកទី៤
ព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាព / សមិទ្ធិផល និងការវិភាគពីកម្មវិធីនីមួយៗ ដែលបានអនុវត្តដោយ ម.អ.ជ.

៤.១ កម្មវិធីផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ

៤.១.១ ចំនួនគោលដៅ និងសមិទ្ធិផលក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ

ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ម.អ.ជ. បានចុះកិច្ចសន្យាចំនួន ២៥ ជាមួយអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន ២១ (អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន៤ បានអនុវត្តកិច្ចសន្យាម្នាក់២កិច្ចសន្យា) សម្រាប់តភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីថ្មីដល់គ្រួសារជនបទ ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ។ ចំនួនគោលដៅត្រូវតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីថ្មីក្រោមកិច្ចសន្យាទាំង ២៥ មានចំនួន 5,331 គ្រួសារ។ ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីចុះកិច្ចសន្យា តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី១**។

ក្នុងចំណោមកិច្ចសន្យាទាំង២៥ ខាងលើ កិច្ចសន្យាមួយចំនួនបានអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យ១០០% ក្នុងរយៈពេលកិច្ចសន្យា ចំណែកឯកិច្ចសន្យាមួយចំនួនទៀតបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារជនបទគោលដៅគ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីថ្មីបានសម្រេចតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា និងកិច្ចសន្យាទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ស្របតាមសុពលភាពនៃអាណត្តិកិច្ចសន្យា ហើយកិច្ចសន្យាមួយចំនួនទៀតនៅកំពុងបន្តអនុវត្ត ដោយរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យានៅមានសុពលភាព ក្រោយថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។ ព័ត៌មានស្តីពីចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅគ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ ចំនួនគ្រួសារគោលដៅគ្រោងភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីមិនបានសម្រេចនិងត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **តារាងទី១** ខាងក្រោម។

តារាងទី១៖ ព័ត៌មានស្តីពីចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅគ្រោង តភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ ចំនួនគ្រួសារគោលដៅគ្រោងភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីមិនបានសម្រេចនិងត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ល.រ	ខេត្ត	ចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅគ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ជាប់កិច្ចសន្យា (គ្រួសារ)	ចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ (គ្រួសារ)	ចំនួនគ្រួសារគោលដៅគ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីមិនបានសម្រេច និងត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យា (គ្រួសារ)
១	បន្ទាយមានជ័យ	1,241	640	309
២	បាត់ដំបង	400	400	0
៣	កណ្តាល	605	405	200
៤	ពោធិ៍សាត់	500	477	23
៥	ព្រះសីហនុ	200	28	172

៦	ស្វាយរៀង	250	250	0
៧	តាកែវ	2,135	1,264	854
	សរុប	**5,331**	**3,464**	**1,558**

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅ គ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី២**។

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ គ្រួសារជនបទបានទទួលផលដោយផ្ទាល់ក្រោមកម្មវិធីនេះ មានចំនួន 3,464គ្រួសារ។តាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីអង្កេតចន្លោះជំរឿននៃប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣ ចំនួនមនុស្សក្នុង ១គ្រួសារនៅជនបទជាមធ្យមគឺ 4.6នាក់ ដូច្នេះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីនេះ គឺចំនួន 15,934 នាក់។

កម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រនេះ បានផ្តល់នូវកម្លាំងរុញច្រានយ៉ាងខ្លាំងដល់សហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទ ដោយជួយឲ្យចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី (គ្រួសារជនបទ) និងថាមពលអគ្គិសនីលក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់សហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទកើនឡើង។

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិ តាមខេត្តនីមួយៗ ដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **តារាងទី២** ខាងក្រោម។

តារាងទី២៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិ តាមខេត្តនីមួយៗ ដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ល.រ	**ខេត្ត**	**ចំនួនភូមិសរុប**	**ចំនួនភូមិដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ**
១	បន្ទាយមានជ័យ	633	31
២	បាត់ដំបង	749	23
៣	កណ្តាល	1,087	17
៤	ពោធិ៍សាត់	501	33
៥	ព្រះសីហនុ	108	8
៦	ស្វាយរៀង	690	29
៧	តាកែវ	1,116	108
		សរុប	**249**

បញ្ជីឈ្មោះភូមិដែលគ្របដណ្តប់ ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី៣**។

ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី៤**។

៤.១.២ សកម្មភាពចុះពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ

ដើម្បីជានាថា ការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយតម្លាភាព និង ត្រឹមត្រូវ និយោជិត ម.អ.ជ. បានចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ការតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីថ្មីដល់គ្រួសារជនបទគ្រប់សេវាករទាំងអស់ ដែល បានអនុវត្តកម្មវិធីនេះ។ រូបភាពសកម្មមួយចំនួនស្តីពីការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ មានបង្ហាញជូនខាងក្រោម៖

លោកស្រី អ៊ុច ប៉ោ កាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ ០៥៤អ ធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនីនៅឃុំព្រៃផ្តៅ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំតាំយ៉ាប ឃុំចំប៉ា ឃុំក្តាញ់ ឃុំកំផែង ស្រុកព្រៃកប្បាស និងឃុំពន្លៃ ស្រុកអង្គរបុរី (ខេត្តតាកែវ)

៤.២ កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ

៤.២.១ ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះចំនួន 12,000 ប្រព័ន្ធ ដែលបានផ្តល់ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន

គម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន ក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥណទានរបស់ធនាគារពិភពលោក និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់មូលនិធិបរិស្ថានសកល និងថវិកាបរិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២។ ក្រោយពេលគម្រោងនេះចប់ ម.អ.ជ. នៅបន្តការកាងារថែទាំប្រព័ន្ធ និងប្រមូលប្រាក់បង់សងរំលស់ថ្លៃទិញប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះត្រឡប់មក ម.អ.ជ. វិញ។ ព័ត៌មានស្តីពីចំនួនប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះដែល ម.អ.ជ. បានលក់ និងតម្លើងដល់គ្រួសារជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន មានបង្ហាញជូនក្នុង **តារាងទី៣** ខាងក្រោម។

តារាងទី៣៖ ព័ត៌មានស្តីពីចំនួនប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះដែល ម.អ.ជ.បានលក់ និងតម្លើងដល់គ្រួសារជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន

ល.រ	ខេត្ត	ចំនួនប្រព័ន្ធដែលបានតម្លើង		
		៣០វ៉ាត់	៥០វ៉ាត់	សរុប
១	កំពង់ស្ពឺ	232	1,395	1,627
២	កំពង់ធំ	161	4,000	4,161
៣	ក្រចេះ	715	-	715
៤	មណ្ឌលគិរី	91	625	716
៥	ព្រះវិហារ	85	530	615
៦	ពោធិ៍សាត់	28	1,298	1,326
៧	រតនគិរី	-	486	486
៨	សៀមរាប	798	1,556	2,354
សរុប		**2,110**	**9,890**	**12,000**

គ្រួសារជនបទចំនួន 12,000 គ្រួសារ (១ប្រព័ន្ធក្នុង១គ្រួសារ) បានទទួលផលដោយផ្ទាល់ក្រោមកម្មវិធីនេះ។ តាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីអង្កេតចន្លោះជំរឿននៃប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣ ចំនួនមនុស្សក្នុង ១គ្រួសារនៅជនបទជាមធ្យមគឺ 4.6 នាក់។ ដូច្នេះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីនេះគឺ 55,200 នាក់។

ដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះដែលបានតម្លើងឲ្យគ្រួសារជនបទ ដំណើរការជាប្រក្រតី និងដើម្បីប្រមូលថវិកាបង់សងរំលស់ពីអ្នកទិញ ម.អ.ជ. បានជួលក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មនេះ។

បញ្ជីឈ្មោះភូមិដែលបានតម្លើងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ចំនួន 12,000 ប្រព័ន្ធ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទនិងខ្សែបញ្ជូន មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី៥**។

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិបានទទួលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ តាមរយៈប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន មានបង្ហាញជូនក្នុង **តារាងទី៤** ខាងក្រោម។

តារាងទី៤៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិបានទទួលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ តាមរយៈប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីការូបនីយកម្មជនបទនិងខ្សែបញ្ជូន

ល.រ	**ខេត្ត**	**ចំនួនភូមិសរុប**	**ចំនួនភូមិបានទទួលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ តាមរយៈប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ**
១	កំពង់ស្ពឺ	1,358	50
២	កំពង់ធំ	737	127
៣	ក្រចេះ	250	12
៤	មណ្ឌលគីរី	90	34
៥	ព្រះវិហារ	208	31
៦	ពោធិ៍សាត់	501	35
៧	រតនគីរី	240	19
៨	សៀមរាប	923	55
		សរុប	**363**

បញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ មានដូចខាងក្រោម៖

- អ្នកទិញស្នើសុំពន្យារពេលបង់ប្រាក់ ដោយសារពុំមានប្រាក់បង់។
- អ្នកទិញមានលទ្ធភាពបង់ ប៉ុន្តែស្ទាក់ស្ទើរមិនបង់ ដោយលើកហេតុផលថា អ្នកទិញផ្សេងទៀតមិនបង់។
- អ្នកទិញរុះរើប្រព័ន្ធខុសបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ និងគេចវេសមិនបង់ប្រាក់ ដោយលើកហេតុផលថា ប្រព័ន្ធខូចមិនដំណើរការ។
- អ្នកទិញធ្វើចំណាកស្រុក ដោយទុកឲ្យមនុស្សចាស់ជរា និង/ឬ ក្មេងតូចៗចាំផ្ទះ ពុំមានប្រាក់បង់។
- អ្នកទិញដោះប្រព័ន្ធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងយកទៅកាន់ទីតាំងថ្មី ដែលជាកន្លែងពិបាកចូលទៅដល់ ដូចជាចំការ និងឡើងភ្នំ ពិបាកទាក់ទងទារប្រាក់។
- អ្នកទិញទៅធ្វើស្រែចំការ ដោយចាក់សោរផ្ទះ ហើយចោរបានលួចដោះយកប្រព័ន្ធ (អ្នកទិញខ្លះយល់ព្រមសង និងខ្លះមិនព្រមសងថ្លៃប្រព័ន្ធដែលនៅសល់)។
- អ្នកទិញគេចពីផ្ទះ នៅពេលភ្នាក់ងារប្រមូលប្រាក់ទៅដល់ ឬកំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រមូលប្រាក់។
- អ្នកទិញយកលេសពន្យារពេលបង់ប្រាក់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះ។
- ប្រព័ន្ធខូចដោយភ្លើងឆេះ និងរន្ទះបាញ់។ល។ និងអ្នកទិញបដិសេធមិនបង់ប្រាក់ដែលនៅសល់។

រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ប៉ុន្តែត្បិតមានបញ្ហាប្រឈមខាងលើក៏ដោយ ក៏ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះចាត់ទុកថា គួរជាទីពេញចិត្ត។

ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីការូបនីយកម្មជនបទនិងខ្សែបញ្ជូន រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី៦**។

រូបភាពផ្ទះគ្រួសារជនបទមួយចំនួនដែលបានតម្លើងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ

៤.២.២ កម្មវិធីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ អានុភាព ៥០វ៉ាត់ ចំនួន 4,000 ប្រព័ន្ធ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Rich Grid Technology Co., Ltd នៅថ្ងៃទី២២ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ អានុភាព ៥០វ៉ាត់ ចំនួន 4,000 ប្រព័ន្ធជូន ម.អ.ជ.។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះ រំពឹងថានឹងបានទទួលនៅដើមឆ្នាំ២០១៤។ សម្ភារៈប្រព័ន្ធទាំងនេះសម្រាប់លក់ និងតម្លើងឲ្យគ្រួសារជនបទនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។ ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីនេះ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន B.N.P. Power Green (Cambodia) Co., Ltd នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ សម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតម្លើង ប្រមូលប្រាក់សងរំលស់ និងថែទាំប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះចំនួន 4,000ប្រព័ន្ធនេះ។

៤.៣ កម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ

៤.៣.១ ចំនួនគោលដៅ និងសមិទ្ធិផល ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ

ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ម.អ.ជ. បានចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់ថវិកាជួយទុនចំនួន២៤ ជាមួយអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន២៤ សម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ។ព័ត៌មានស្តីពីអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយម.អ.ជ.ដើម្បីទទួលថវិកាជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី៧**។

ក្នុងចំណោមកិច្ចសន្យាទាំង២៤ ខាងលើ កិច្ចសន្យាមួយចំនួនបានអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យ១០០% ក្នុងរយៈពេលកិច្ចសន្យា ចំណែកឯកិច្ចសន្យាមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចគោលដៅតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា និងកិច្ចសន្យាទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ស្របតាមសុពលភាពនៃអាណត្តិកិច្ចសន្យា ហើយកិច្ចសន្យាមួយចំនួនទៀតកំពុងបន្តអនុវត្ត ដោយរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យានៅមានសុពលភាព ក្រោយថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។ ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីប្រវែងខ្សែបណ្តាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា ប្រវែងខ្សែបណ្តាញបានសាងសង់រួចក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **តារាងទី៥** ខាងក្រោម។

តារាងទី៥៖ ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីប្រវែងខ្សែបណ្តាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា ប្រវែងខ្សែបណ្តាញបានសាងសង់រួច ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ល.រ	ខេត្ត	ប្រវែងខ្សែបណ្តាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា (km)	ប្រវែងខ្សែបណ្តាញបានសាងសង់រួច (km)
១	បន្ទាយមានជ័យ	34	6
២	បាត់ដំបង	19	19
៣	កំពង់ឆ្នាំង	28	22
៤	កំពង់ស្ពឺ	12.7	0
៥	កំពត	22.5	0
៦	កណ្តាល	12	0
៧	កោះកុង	22.95	6.45
៨	ក្រចេះ	8	0
៩	ព្រៃវែង	13.63	0
១០	ពោធិ៍សាត់	27.40	10.92
១១	ព្រះសីហនុ	5	0
១២	តាកែវ	40	14
	សរុប	**245.18**	**78.37**

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីប្រវែងខ្សែបណ្តាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា ប្រវែងខ្សែបណ្តាញបាន

សាងសង់រួច និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី៨**។

ហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណបានទទួលផលដោយផ្ទាល់ក្រោមកម្មវិធីនេះ មានចំនួន ២៤ អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ កម្មវិធីនេះបានផ្តល់នូវកម្លាំងរុញច្រានយ៉ាងខ្លាំងដល់សហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងតំបន់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលឿន និងគ្រួសារជនបទកាន់តែច្រើនគ្រួសារអាចទទួលបាននូវសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដែលមានគុណភាពពីប្រព័ន្ធបណ្តាញសហគ្រាសអគ្គិសនីជនបទ។

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **តារាងទី៦** ខាងក្រោម។

តារាងទី៦៖ ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ល.រ	ខេត្ត	ចំនួនភូមិសរុប	ចំនួនភូមិទទួលការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
១	បន្ទាយមានជ័យ	633	3
២	បាត់ដំបង	749	8
៣	កំពង់ឆ្នាំង	557	17
៤	កំពង់ស្ពឺ	12.7	0
៥	កំពត	22.5	0
៦	កណ្តាល	12	0
៧	កោះកុង	22.95	6.45
៨	ក្រចេះ	8	0
៩	ព្រៃវែង	1,137	2
១០	ពោធិ៍សាត់	501	8
១១	ព្រះសីហនុ	108	2
១២	តាកែវ	1,116	6
	សរុប		**46**

បញ្ជីឈ្មោះភូមិដែលគ្របដណ្តប់ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី៩**។

ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែល ម.អ.ជ. បានផ្តល់ថវិកាទុនជួយសម្រាប់ពង្រីការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធទី១០**។

៤.៣.២ សកម្មភាពចុះពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ

ដើម្បីធានាថា ការអនុវត្តកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយតម្លាភាព និងត្រឹមត្រូវ និយោជិត ម.អ.ជ. បានចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ការសាងសង់គ្រប់សេវាករទាំងអស់ ដែល

បានអនុវត្តកម្មវិធីនេះ។ រូបភាពសកម្មមួយចំនួនស្តីពីការចុះផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្សែបណ្តាញថ្មីដែលបានសាងសង់រួច មានបង្ហាញជូនខាងក្រោម៖

លោក ឈួ ងួន កាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ ០៣៣អ ធ្វើសេវាកម្មនៅផ្នែកខ្លះនៃឃុំបឹងខ្នារ
ឃុំខ្នារទទឹង និងឃុំមេទឹក ស្រុកបាកាន (ខេត្តពោធិ៍សាត់)

៤.៤ កម្មវិធីសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពស្ថានីយវារីអគ្គិសនីខ្នាតតូច

ម.អ.ជ. បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ និងក្រុមហ៊ុនឯកជនស្តីពីលទ្ធភាពនៃកាអភិវឌ្ឍន៍រោងចក្រវារីអគ្គិសនីខ្នាតតូចនៅតំបន់ជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ម.អ.ជ. បានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ

ក្រុមហ៊ុន Seabell International ពីបញ្ហាខាងលើ និងបានចុះទៅពិនិត្យដល់ទីតាំងរមណីដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកល្មៀង ឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

រូបភាពសកម្មភាពប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Seabell International និងការចុះពិនិត្យទីតាំង
រមណីដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកល្មៀង ឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់

ឧបសម្ព័ន្ធទី១

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីចុះកិច្ចសន្យា តាមខេត្តនីមួយៗ ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ

ខេត្ត/ក្រុង	តំបន់ធ្វើសេវាកម្ម	លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ	ឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ	ភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធបណ្តាញ
បន្ទាយមានជ័យ	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំភ្នំតូច ឃុំចំណោម ឃុំសឿ និងឃុំអូរប្រាសាទ ស្រុកមង្គលបូរី	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំឈ្នួរមានជ័យ ឃុំព្រះនេត្រព្រះឃុំជប់វារី និងឃុំរហាល ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ	១០៨អ	លោកស្រី ស៊ីន សាវួន	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំអូរបីជាន់ ស្រុកអូជ្រៅ	២៧៦អ	លោក ដុន រិទ្ធី	ប្រព័ន្ធបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យមពីក្រុមហ៊ុនអានកូភ្ជាប់ពីប្រទេសថៃ
	ផ្នែកខ្លះនៃស្រុកក្រឡាញ់ និងស្រុកព្រះនេត្រព្រះ	១៦៤អ	ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អ៊ិន ធី អង្គរ	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
បាត់ដំបង	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបឹងព្រីង ស្រុកថ្មគោល	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំតាម៉ឺន និងឃុំជ្រោយស្ដៅ ស្រុកថ្មគោល	២០១អ	លោក អ៊ូ ចាន់វត្ថែ	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំជ្រៃ និងឃុំអូរតាគី ស្រុកថ្មគោល	២០២អ	លោកស្រី គង់ សាម៉ុន	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
កណ្តាល	ឃុំរកាកោង១ និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំរកាកោង២ និងឃុំព្រែកដំបង ស្រុកមុខកំពូល	០៣៧អ	លោក អៀង សេងហ៊ី	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំក្រាំងយ៉ូវ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំទឹកវិល និងឃុំស្អាងភ្នំ ស្រុកស្អាង	១៧៩អ	លោក ញ៉ឹក ម៉ី សហគ្រាសអគ្គិសនី ញ៉ឹក ម៉ី	ប្រព័ន្ធបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម និងប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
ពោធិ៍សាត់	ឃុំបឹងកន្ទួត ឃុំឆ្នោតជុំ ឃុំអូរសណ្ដាន់ ឃុំស្នាអន្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត	១២៥អ	លោក យក់ សារង្ស	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ

	ឃុំក្បាលត្រាច និងឃុំអន្សាចំបក់ ស្រុកក្រគរ			
ព្រះសីហនុ	ឃុំព្រៃនប់ ឃុំទួលទទឹង ឃុំអណ្តូងថ្ម និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំអូរឧកញ៉ាហេង និងឃុំបឹងតាព្រហ្ម ស្រុកព្រៃនប់	១៨៤អ	លោកស្រី ជា គឹមថាត	ប្រព័ន្ធបណ្តាញកំពត-ព្រះសីហនុ
ស្វាយរៀង	ឃុំក្សេត ឃុំសំឡី និងឃុំត្នោត ស្រុកកំពង់រោទ៍ ឃុំច្រេស ឃុំចន្ទ្រា និងឃុំទួលស្តី ស្រុកចន្ទ្រា	២៦៨អ	លោក តាក បូរ៉ា	ប្រព័ន្ធបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម
តាកែវ	ឃុំតាអូរ ឃុំកំណប់ ឃុំគិរីចុងកោះ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំភ្នំដិន ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ និងឃុំសោម ស្រុកគីរីវង់	០១៣អ	សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធីគិរីវង់	ប្រព័ន្ធបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម
	ទីប្រជុំជនផ្សារសំរោងយ៉ោង ឃុំត្រពាំងសាប ឃុំចំប៉ី ឃុំកណ្តឹង ឃុំពារាម ស្រុកបាទី	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធីសំរោងយ៉ោង	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំគោកពោធិ៍ ឃុំដូងខ្ពស់ និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំបូរីជលសារ ស្រុកបូរីជលសារ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំគោកធ្លក ស្រុកអង្គរបុរី និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំអង្កាញ់ ស្រុកទ្រាំង	០២២អ	លោក គង់ ផាត	ប្រព័ន្ធបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម
	ឃុំព្រៃផ្តៅ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំតាំងយ៉ាប ឃុំចម្ប៉ា ឃុំក្តាញ់ និងឃុំកំពែង ស្រុកព្រៃកប្បាស និងឃុំពន្លៃ ស្រុកអង្គបុរី	០៥៤អ	លោកស្រី អ៊ូច ប៉ោ	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំព្រៃកផ្លោល ឃុំអង្គរបុរី និងទីរួមស្រុកអង្គបុរី	១១៣អ	លោក នូ គ្រុយ	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំសំរោង ឃុំសឹង្ហ ឃុំស្លា ឃុំទ្រា និងឃុំជើងកួន ស្រុកសំរោង	១៧៨អ	លោក ពេជ្រ សុភាព	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំតាំងយ៉ាប ឃុំក្តាញ់ និងឃុំចំប៉ា ស្រុព្រៃកប្បាស	២១២អ	លោក ង៉ែត ម៉េង	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំដូង ស្រុកបាទី	២៣១អ	លោក មុី ស៊ីណា	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំកំពែង ស្រុកព្រៃកប្បាស ឃុំពន្លៃ ស្រុកអង្គរបូរី	២៣៨អ	លោក ហ៊ូ វាស្នា	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំព្រៃផ្តុំ ស្រុកអង្គបូរី	២៧៣អ	លោក ជា សុវណ្ណារ៉ា	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ

ឧបសម្ព័ន្ធទី២

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅ គ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ឈ្មោះខេត្ត	លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ	ឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ	ចំនួនគ្រួសារជនបទគោលដៅគ្រោងតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ជាប់កិច្ចសន្យា (គ្រួសារ)	ចំនួនគ្រួសារជនបទបានតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ (គ្រួសារ)	សំគាល់
បន្ទាយមានជ័យ	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន	200	200	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	១០៨អ	លោកស្រី ស៊ីន សាវួន	200	200	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	២៧៦អ	លោក ជុន រិទ្ធី	292	0	កំពុងអនុវត្ត
	១៦៤អ	ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អ៊ិន ជី អង្គរ	549	240	បិទគម្រោង
បាត់ដំបង	២០១អ	លោក អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន	200	200	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	២០២អ	លោកស្រី គង់ សាម៉ុន	200	200	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
កណ្តាល	០៣៧អ	លោក អៀង សេងហ៊ី	200	0	បរាជ័យនិងបិទគម្រោង
	១៧៩អ	លោក ញ៉ឹក ម៉ី	200	200	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	១៧៩អ	សហគ្រាសអគ្គិសនី ញ៉ឹក ម៉ី	205	205	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
ពោធិ៍សាត់	១២៥អ	លោក យក់ សាវង្ស	500	477	បិទគម្រោង
ព្រះសីហនុ	១៨៤អ	លោកស្រី ជា គឹមថាត	200	28	កំពុងអនុវត្ត
ស្វាយរៀង	២៦៨អ	លោក តាក បូរ៉ា	250	250	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
តាកែវ	០១៣អ	សហគ្រាស អេឡិកទ្រីស៊ីធី គិរីវង់	330	0	បិទគម្រោង

	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិចទ្រីស៊ីធីសំរោងយ៉ោង	250	250	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិចទ្រីស៊ីធីសំរោងយ៉ោង (គម្រោងទី២)	80	80	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	០២២អ	លោក គង់ ផាត	100	47	បិទគម្រោង
	០៥៤អ	លោកស្រី អ៊ូច ប៉ោ	200	21	បិទគម្រោង
	១១៣អ	លោក នូ គ្រុយ	150	150	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	១១៣អ	លោក នូ គ្រុយ (គម្រោងទី២)	65	0	បរាជ័យនិងបិទគម្រោង
	១៧៨អ	លោក ពេជ សុភាព	110	110	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	២១២អ	លោក ង៉ែត ម៉េង	330	201	បិទគម្រោង
	២៣១អ	លោក ម៉ី ស៊ីណា	150	52	បិទគម្រោង
	២៣៨អ	លោក ហ៊ូ វាស្នា	150	150	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	២៧៣អ	លោក ជា សុវណ្ណារ៉ា	150	150	បានជោគជ័យនិងបិទគម្រោង
	២៧៣អ	លោក ជា សុវណ្ណារ៉ា (គម្រោងទី២)	70	53	កំពុងអនុវត្ត
		សរុប	**5,331**	**3,464**	

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣

បញ្ជីឈ្មោះភូមិគ្របដណ្តប់ក្រោមកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ល.រ	លេខកូដឃុំ	ចំនួនភូមិដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ	ឈ្មោះឃុំ	ឈ្មោះស្រុក	លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ	អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ
១	**បន្ទាយមានជ័យ**					
	១០២០៣	ដូវខ្ចាស់ បឹងត្រស់ ដងត្រាង	ចំណោម	មង្គលបូរី	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន
	១០២០៨	កស្វាយ	រហាត់ទឹក	មង្គលបូរី	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន
	១០២០៧	ភ្នំតូចជើង ភ្នំតូចត្បូង វត្តថ្មី មនោរម្យ បឹងរាំង ថ្នល់បត់ អូរញ្រជើង	ភ្នំតូច	មង្គលបូរី	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន
	១០៤០៥	ប៉ោយក្តឿង	ព្រះនេត្រព្រះ	ព្រះនេត្រព្រះ	១០៨អ	លោកស្រី ស៊ីន សាវ៉ន
	១០៤០៦	ស្នាយ អន្លង់ថ្ម	រហាល		១០៨អ	លោកស្រី ស៊ីន សាវ៉ន
	១០៥០៩	បន្ទាយថ្មី យាងដង្កុំ ថ្នល់បត់ ទំនប់ដាច់ ជោគជ័យ ប្រសាទ អូរបីជាន់ សិលាខ្មែរ	អូរបីជាន់	អូរជ្រៅ	២៧៦អ	លោក ជុន រិទ្ធី
	១០៤០៨	សំរោង ស្នាយល្អ ថ្មី	ទឹកជោរ	ព្រះនេត្រព្រះ	១៤៦អ	ក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ អ៊ិន ជី អង្គរ
២	**បាត់ដំបង**					
	២០២០៧	បឹងព្រីង ប៉ោយតាសេក អូរញ្រត្បូង	បឹងព្រីង	ថ្មគោល	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន
	២០២០៦	ជ្រោយស្តៅ និគមន៍ក្រៅ និគមន៍ក្នុង	ជ្រោយស្តៅ	ថ្មគោល	២០១អ	លោក អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន
	២០២០២	តាសី ថ្មី សំរោង កោគគ្រប់ ទំនាប ក្រសាំង ជ្រោយម្ទេស	តាម៉ឺន	ថ្មគោល	២០១អ	លោក អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន
	២០២០៤	ពពាលខែ ក្បាលខ្មោច ហែសាន ស្វាយជ្រុំ ជ្រៃថ្មី ព្រៃទទឹង កគោ ជ្រៃ ព្រៃចាស់	ជ្រៃ	ថ្មគោល	២០២អ	លោកស្រី គង់ សាម៉ុន

	២០២០៣	កកោះ	អូរតាគី	ថ្មគោល	២០២អ	លោកស្រី គង់ សាម៉ុន
៣	កណ្ដាល					
	៨១០០៥	ធំ អំពិល តាគល់ អង្គ តាពេជ កណ្ដាល ចេក សំរោង អណ្ដូង រកា វិហារ គរ ពីងពង់ ទួលក្រាំង កំពង់ពោធិ៍	ក្រាំងយ៉ូវ	ស្អាង	១៧៩អ	លោក ញ៉ឹក ម៉ី
	៨១០១០	គោកអណ្ដែត	ស្អាងភ្នំ	ស្អាង	១៧៩អ	លោក ញ៉ឹក ម៉ី
	៨១០១៦	ព្រែករាំង	ទឹកវិល	ស្អាង	១៧៩អ	លោក ញ៉ឹក ម៉ី
៤	ពោធិ៍សាត់					
	១៥០៣០៨	អូរអាចម៍កុក ក្រាំងធំ អូរតាប្រុក ពុទ្រាម ខ្នឹង ចុងខ្លុង ថ្មឹង ដូងជួរ ពោធិ៍របង មាត់ព្រៃ	អូរសណ្ដាន់	ក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សាវង្ស
	១៥០៣០៩	វាលវង់ ស្នាអន្សា សារវ័ន្ត	ស្នាអន្សារ	ក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សាវង្ស
	១៥០៣០១	ថ្កោលធំ ទន្សាយគល់ ផ្សារ បប៉ិត បន្ទាយក្រង	អន្លង់ត្នោត	ក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សាវង្ស
	១៥០៣០៧	ត្រពាំងរំដេង កំពង់លើ សំរោង ត្រពាំងស្នាច់ កណ្ដាល ទទឹង ស្រែឬស្សី	ក្បាលត្រាច	ក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សាវង្ស
	១៥០៣០២	ខ្សាច់ល្អិត សានសរ ថ្កោលធំ ថ្កោលតូច អារ៉ងព្រួច ក្បាលដំរី ផ្លូវកណ្ដាល	អន្សាចំបក់	ក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សាវង្ស
	១៥០៣០៥	ទី២	កំពង់លួង	ក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សាវង្ស
៥	ព្រះសីហនុ					
	១៨០២០៧	ព្រៃនប់១ ព្រៃនប់២ បត់សិមាន់	ព្រៃនប់	ព្រៃនប់	១៨៤អ	លោកស្រី ជា គឹមថាត
	១៨០២១៣	ទួលទទឹង៣	ទួលទទឹង	ព្រៃនប់	១៨៤អ	លោកស្រី ជា គឹមថាត
	១៨០២០១	ត្រពាំងស្អុយ២	អណ្ដូងថ្ម	ព្រៃនប់	១៨៤អ	លោកស្រី ជា គឹមថាត
	១៨០២០៦	អូរតាប៉ាង បត់គគីរ អូរឧញ្ញាហេង	អូរឧញ្ញាហេង	ព្រៃនប់	១៨៤អ	លោកស្រី ជា គឹមថាត

៦	ស្វាយរៀង					
	២០០១០៤	ទួលកំពឹស ត្រពាំងដៀលើ ត្រពាំងដៀក្រោម ទួលស្ពាន ទួលអំពិល ស្វាយគុយ ត្រពាំងរុន ដូនណូយ ត្រពាំងធ្លក	ប្រេស	ចន្ទ្រា	២៦៨	លោក តាក ប៉ូរ៉ា
	២០០១០៣	ចន្ទ្រា	ចន្ទ្រា	ចន្ទ្រា	២៦៨	លោក តាក ប៉ូរ៉ា
	២០០២០៧	តាប៉ោ ព្រៃភ្លៀត សំឡីខាងជើង ស្វាយ សំឡីខាងត្បូង ព្រៃម្នាស់	សំឡី	កំពង់រោទិ៍	២៦៨	លោក តាក ប៉ូរ៉ា
	២០០២១៧	ជំ ពោធិ៍ម្អម បុណ្យ	ត្នោត	កំពង់រោទិ៍	២៦៨	លោក តាក ប៉ូរ៉ា
	២០០២០៩	ព្រៃធ្លក ព្រៃប្រើស	ស្វាយតាយ៉ាង	កំពង់រោទិ៍	២៦៨	លោក តាក ប៉ូរ៉ា
	២០០២០៣	ព្រៃតាញ៉យ សាម៉ ប្រៃចារ ត្រពាំងកំពឹស កណ្តាល ថ្មី កំពឹស ត្រោក	ខ្សែត្រ	កំពង់រោទិ៍	២៦៨	លោក តាក ប៉ូរ៉ា
៧	តាកែវ					
	២១០២០៤	ក្រសាំង ក្រាំងអំពិល	កណ្ដឹង	បាទី	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធី សំរោងយ៉ោង
	២១០២១៥	ចក ពូនភ្នំ ត្រពាំងទឹម ដើមក្រាយ ត្រកៀត តាស៊ូ រលាំង គ្រើល ស្មៅខ្ចី រកាខ្ពស់ ព្រេជ អាជាំង សង្កែ ស្តុកប្រិយ៍ ត្រពាំងសាង ខ្សាច់លប់ ត្រពាំងសាប	ត្រពាំងសាប	បាទី	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធី សំរោងយ៉ោង
	២១០២០៩	ជំរៅ តាំងញាតិ ត្រពាំងយោង គ្រួស ក្រាំងក្រចាង ពារាម	ពារាម	បាទី	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធី សំរោងយ៉ោង
	២១០២០២	មឿងប្រចិន ព្រៃក ប្រៃមូល	ចំប៉ី	បាទី	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធី សំរោងយ៉ោង
	២១០៣០៣	សូភី តាសែ តាយឹង អង្កាញ់ ព្រៃម្លប់ ដូងខ្ពស់ ត្រើយឃ្លោក ត្រពាំងទន្លេ តារស់ រទេះភ្លក	ដូងខ្ពស់	បូរីជលសារ	០២២អ	លោក គង់ ផាត

	២១០៦១១	ព្រៃភ្ញី ដុង	ព្រៃផ្ដៅ	ប្រេកប្បាស	០៥៤អ	លោកស្រី អ៊ួច ប៉ោ
	២១០៦០៥	តាមូង កំពែងត្បូង	កំពែង	ប្រេកប្បាស	០៥៤អ	លោកស្រី អ៊ួច ប៉ោ
	២១០១០១	ព្រៃសំបួរ កំពង់លួង សាមគ្គី ស្ទឹងកំបុត	អង្គរបូរី	អង្គរបូរី	១១៣អ	លោក នូ គ្រុយ
	២១០១០៥	កំពង់ពោធិ៍ អង្គរ	ព្រៃកផ្ទោល	អង្គរបូរី	១១៣អ	លោក នូ គ្រុយ
	២១០៧០៨	ដីក្រហម ស្វាយ ក្រាំងរអួត ទួលចារ ព្រៃទទឹង សំរោង កន្សោមអក	សំរោង	សំរោង	១៧៨អ	លោក ពេជ្រ សុភាព
	២១០៧១០	ត្រពាំងត្រាវ អង្គចង្អេរ ស្រីបណ្ឌិត	ស្លា	សំរោង	១៧៨អ	លោក ពេជ្រ សុភាព
	២១០៧០៣	ត្រពាំងវិហារ តាខួច ត្បាច ត្រពាំងវែង តាម៉ៅ អញ្ចាញ ថ្កូវ ជើងគួន ពន្សាំង	ជើងគួន	សំរោង	១៧៨អ	លោក ពេជ្រ សុភាព
	២១០៧១១	សំបួរ ទ្រាលើ កំពង់ទ្រា ដូង ដូនតី វែង ឬស្សីជ្រុំ ត្នោតទេរ ផ្នា	ទ្រា	សំរោង	១៧៨អ	លោក ពេជ្រ សុភាព
	២១០៦០៧	សម្ដេចពាន់ វាល ក្រាំងវិច ក្ដាញ់ ក្បូម អង្គរ	ក្ដាញ់	ព្រៃកប្បាស	២១២អ	លោក ង៉ែត ម៉េង
	២១០៦០៣	ជ្រយ ដង្ហិត ឬស្សីថ្មី	ចំប៉ា	ព្រៃកប្បាស	២១២អ	លោក ង៉ែត ម៉េង
	២១០៦១៣	អង្គរវាយ ត្រពាំងទា ព្រៃចំបក់ ស្នួលខ្ពស់ កែវចំរើន ច្រនៀងខ្ពស់	តាំងយ៉ាប	ព្រៃកប្បាស	២១២អ	លោក ង៉ែត ម៉េង
	២១០២១៣	ថ្មី	ត្នោត	បាទី	២៣១អ	លោក ម៉ី ស៊ីណា
	២១០២០៣	ដូង ក្រាំងប្រទាល ចេក ប្រមូលសុក យុផ្កា កណ្ដាល	ដូង	បាទី	២៣១អ	លោក ម៉ី ស៊ីណា
	២១០៦០៤	អំពិលលិច	ចារ	ប្រេកប្បាស	២៣១អ	លោក ម៉ី ស៊ីណា
	២១០១០៤	ពន្លៃ សំរោង ធ្លកយល់ ស្រម៉ុក	ពន្លៃ	អង្គរបូរី	២៣៨អ	លោក ហ៊ូ វាស្នា
	២១០៦០៥	ចង្កើប	កំពែង	ព្រៃកប្បាស	២៣៨អ	លោក ហ៊ូ វាស្នា
	២១០១០៦	ព្រៃផ្ដៅក ព្រៃផ្ដៅខ ព្រៃផ្ដៅគ ព្រៃផ្ដៅ ទ្រង់ភូមិ	ព្រៃផ្ដៅ	អង្គរបូរី	២៧៣អ	លោក ជា សុវណ្ណារ៉ា

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤

ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់គ្រួសារក្រីក្រ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

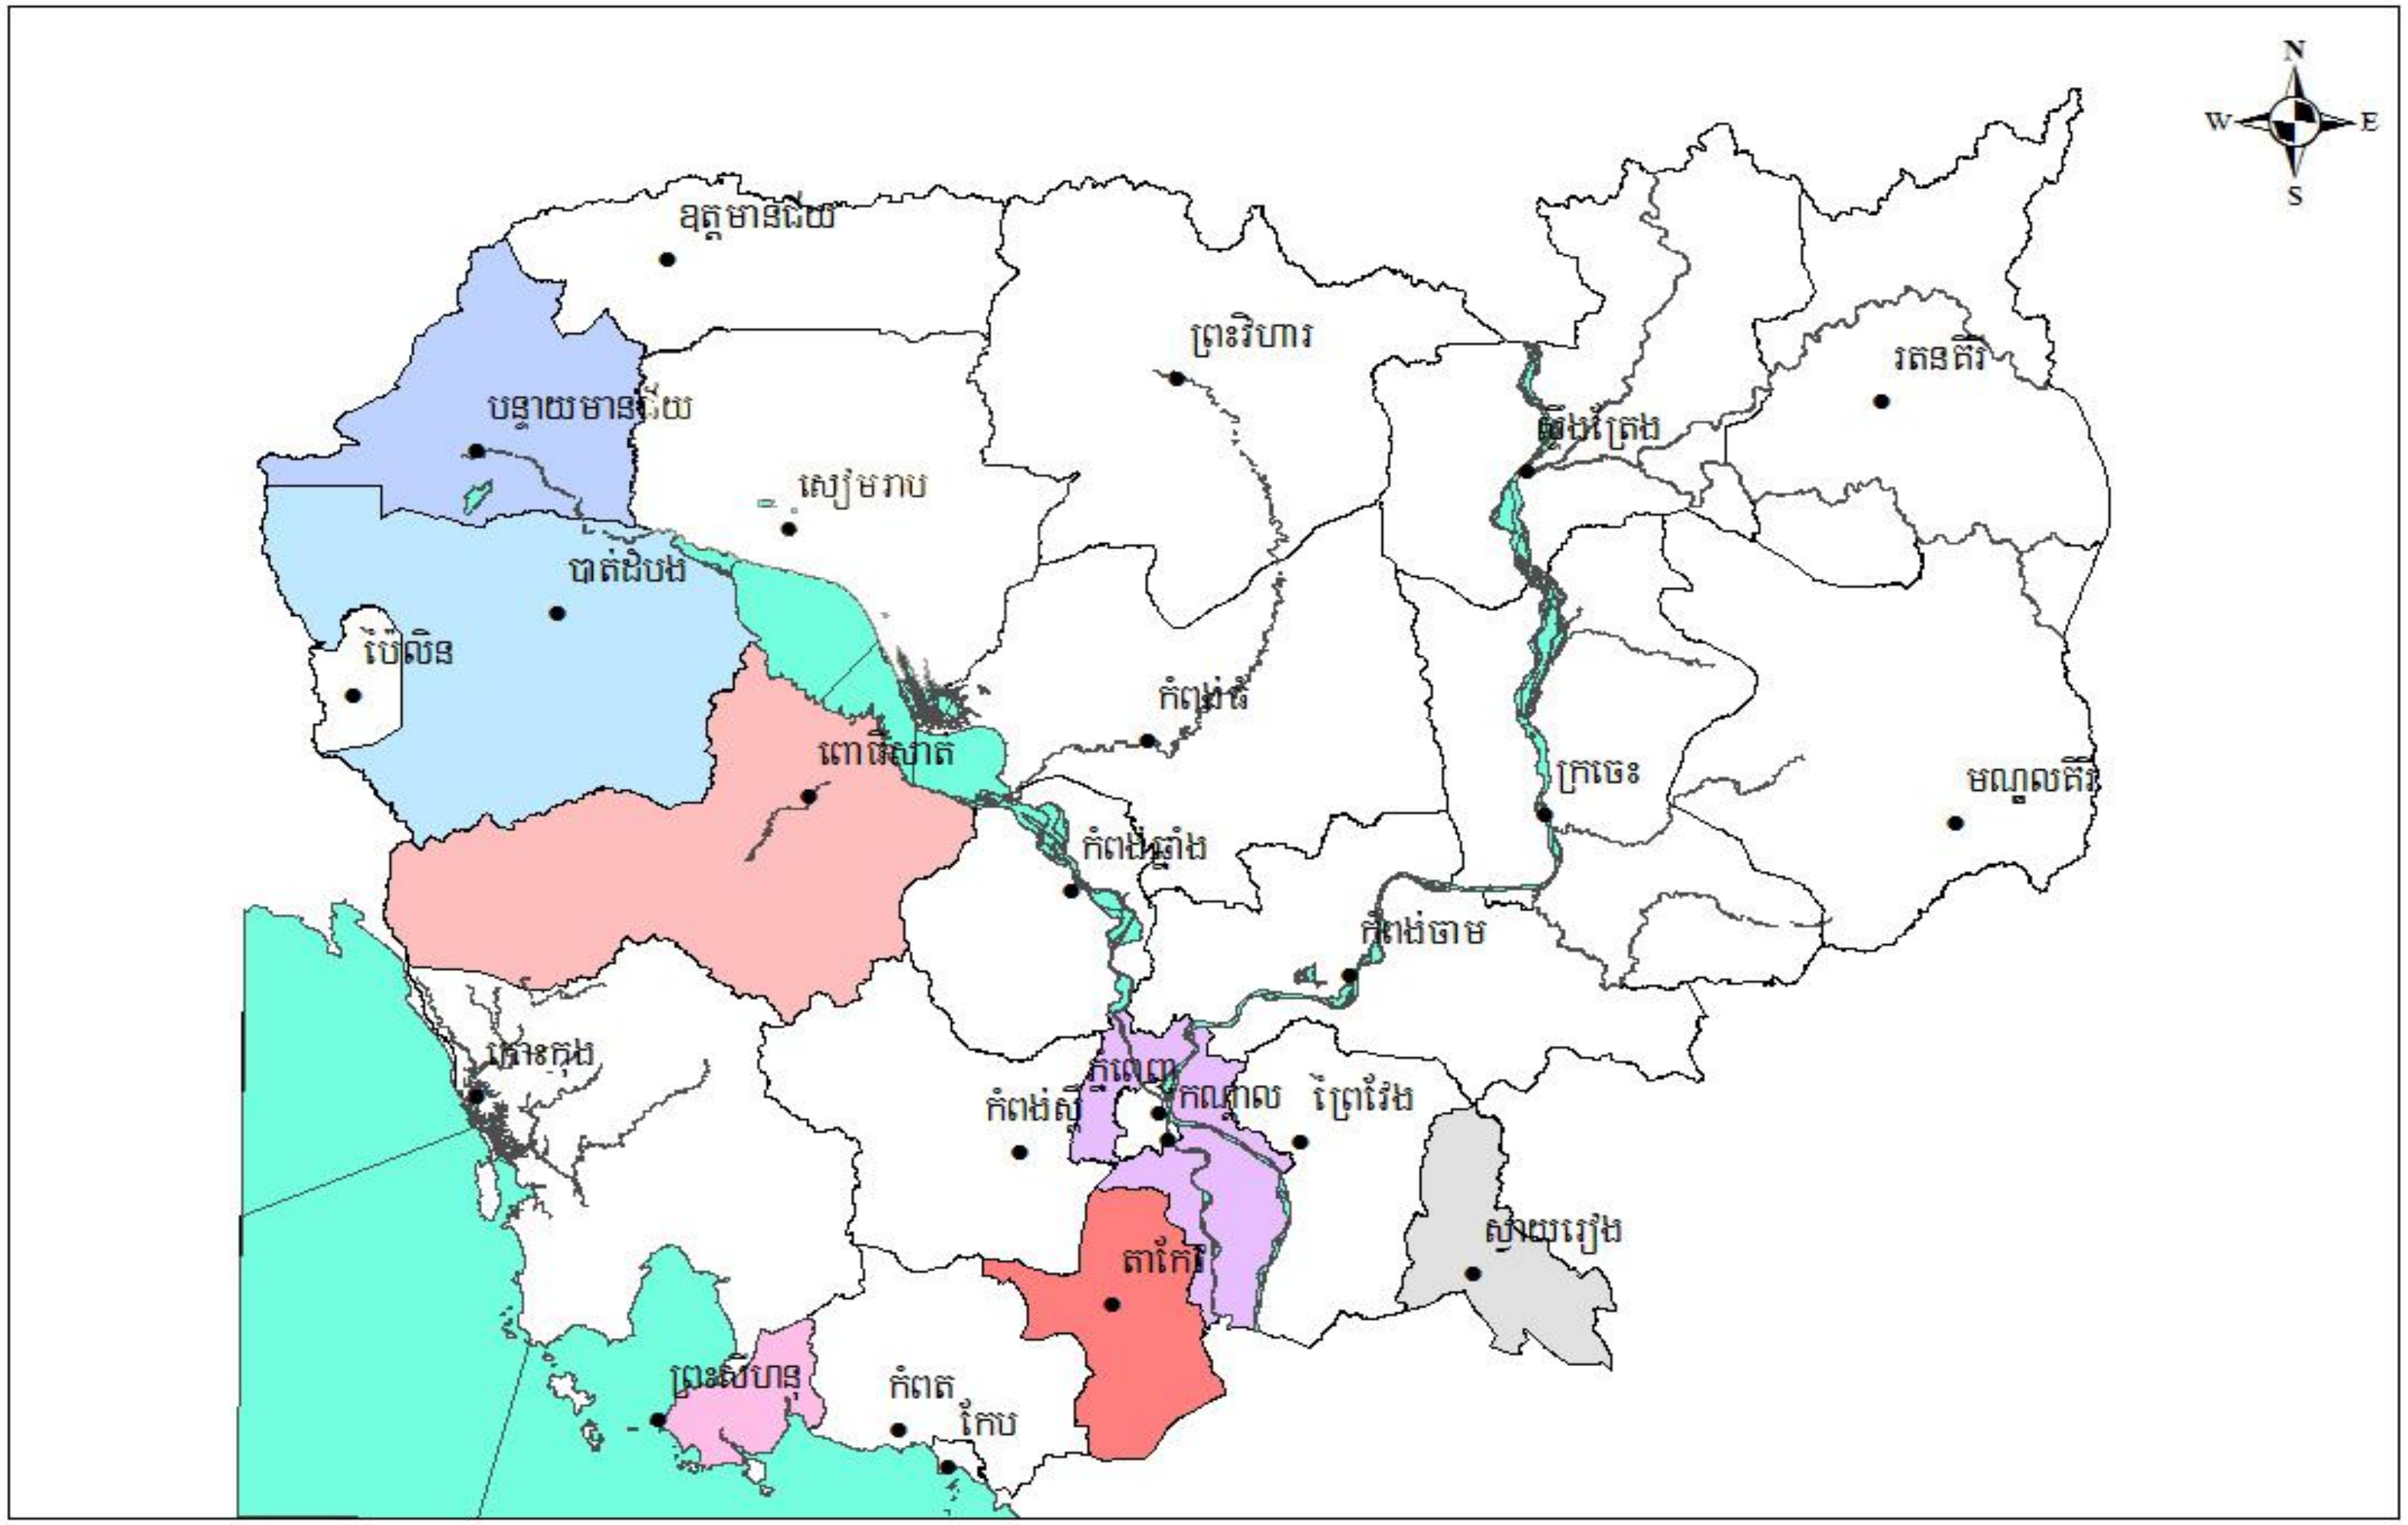

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥

បញ្ជីឈ្មោះភូមិដែលបានតម្លើងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ចំនួន 12,000 ប្រព័ន្ធ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីការូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន

ល.រ	លេខកូដឃុំ	ចំនួនភូមិបានទទួលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ	ឈ្មោះឃុំ	ឈ្មោះស្រុក
១	កំពង់ស្ពឺ			
	៥០៤០១	ចំប៉ី ដីផ្ទាំង ព្រៃទទឹង មនោរម្យ ក្រាំង ក្រាំងគគីរ ក្រាំងតាវ៉ា តាំងរបង ទួលផ្ទង់	ហោងសំណំ	ឱរ៉ាល់
	៥០៤០២	ពាមរស់ អូរផ្តៅ រស្មី	រស្មីសាមគ្គី	
	៥០៤០៤	ដំបងវេញ គោក ស្រែវៀន ព្រីងកោង ត្រពាំងគង តាដែស ទួលឈើនាង	សង្កែសាទប	
	៥០៦០១	បេង ថ្មី ក្រាំងចេក	ចំបក់	ភ្នំស្រួច
	៥០៦០៩	ដីក្រហម ដៃថ្មី ព្រៃក្បុង	ព្រៃក្មេង	
	៥០៦១៣	ច័ន្ទគីរី ចំបក់ ចង្កម ដំបូងខ្ពស់ ដើមផ្ចៀក ស្បែកព្រាល សែនជ័យ អាយា អូរបទ កងមាស កំពង ក្រសាំង ព្រីង ប្រសព្វជុំ ត្រពាំងសារាយ សាមគ្គី ទីបី ទីពីរ ទីបួន ទីមួយ ទីប្រាំ ទឹកចេញ វាលធំ	ត្រែងត្រយឹង	
	៥០៦០៧	កូនត្រុំ	អូរ	
	៥០៦០៤	ក្រាំងប្រេស ក្រាំងសេរី តាំងស្យា	គិរីវ័ណ្ណ	
២	កំពង់ធំ			
	៦០៥០១	បឹងខ្វែក សេរីសុខា អន្លង់ស្លែង អន្សរក្រហាយ ឈូកបឹង ឈូកគ្រួស ឈូកស្ទឹង ប្រាសាទ ក្របៅ ត្រពាំងសាលា តាអោក ទឹកអណ្តូង	ឈូក	ប្រាសាទសំបូរ
	៦០៥០៥	ដីនាង គោកស្រុក ព្រៃក្តី ថ្មី កំពង់ក្រសាំង ប្រឡាយឃុំ សូរិយា តាំងស្នោង តាំងក្រសៅ ទឹកអណ្តូង	តាំងក្រសៅ	
	៦០៦០២	ស្រែវាលខាងកើត ស្រែវាលខាងលិច ស្រែខ្សាច់ សំព័រតូច	ដងកាំបិត	សណ្តាន់
	៦០៦០៣	ពាមក្លែង ក្លែង គុម្ពោតឈូក រកាជួរ ត្រកួន ទឹកវិល	ក្លែង	
	៦០៦០១	បឹងប្រា បឹងរលំ ចំផ្កា កៃរ៉ង ឈើទាល ព្រៃកន្លែង អណ្តូងព្រីង កំពង់តាបែន សំរិទ្ធ វាលព្រីងក្រោម	ឈើទាល	
	៦០៦០៦	ងន អូរត្នោត ស្រទៀ ត្រឹប សំភី តាំងក្រសៅ វាលព្រីងលើ	ងន	

	៦០៦០៥	ពពឹង ដាំផល ដាន់លែង ចេកមួយ ផ្ទោល ថ្មី រំពុះ រនាម ត្របែក សមរម្យ វាលស្នាយ	មានជ័យ	
	៦០៦០៤	បឹង ដាំស្វាយ អូរពក កន្ទី សំអោង ត្បូងទឹក	មានរិទ្ធ	
	៦០៦០៧	ស្រែចង់	សណ្ដាន់	
	៦០៦០៨	ពោធិ៍រោង ព្រេន អន្សា ក្រាំង រំចេក ត្រយ៉ង	សុចិត្រ	
	៦០៦០៩	លែង រន្ទះ ស្រឡៅស្រង សំរោង	ទំរីង	
	៦០៤០១	ដងផ្ដៀក ដូង គគរ ក្របៅ គ្រួស តាមុំ	ដូង	ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
	៦០៤០៣	ផ្ដៀក ព្រៃដំរី ស្មោញ ក្រញូង ត្រពាំងក្នុង សុដុល	ផាន់ញើម	
	៦០៤០២	បាពយណ៍ បុស្សធំ អន្លង់ជួរ ក្រយាជើង ក្រយាត្បូង	ក្រយា	
	៦០៤០៥	ឬស្សីជ្រួច បុស្សវែង បុស្សស្រមោច ជ័យ ដងអន្ទាក់ ស្រែ អណ្ដាស អូរក្រូច គគីរ ក្វាន់ទៀង ត្រពាំងផ្ដៀក ត្រពាំងក្រោល ត្រពាំងថ្ម សាលាពពេល សាលាវិស័យ តាឡោកថ្មី វាលល្អាក់ ខ្នាក់	សាលាវិស័យ	
	៦០៤០៦	ចាន់សេរី ថ្មី សំរោង	សាមគ្គី	
	៦០៤០៤	អូរអង្គរ អូរខ្សង់ សាគ្រាមខាងជើង សាគ្រាមខាងត្បូង វាល់ថ្មល់	សាគ្រាម	
	៦០៤០៧	ជន្លួស ធំ ក្រពើ ម្រាកក ម្រាកខ ទួលគ្រើល	ទួលគ្រើល	
៣	**ក្រចេះ**			
	១០០២០៥	បានទេ បុសលាវលើ ចុងក្រាង ព្រែកកូវ កុំម៉ា កសាង ព្រះគន្លង ច្រាំកោះដាច់ ក្រូលូប សំរិត សុំរាត តាលុស	គោលប់	ចិត្របូរី
៤	**មណ្ឌលគីរី**			
	១១០៤០៤	ប៊ូស្រា ពូចារ ពូតឿត ពូលុក ពូរាំង ឡាំមេ ពូជ្រៃយ៉ាង ពូតាង	ប៊ូស្រា	ពេជ្រចិន្ដា
	១១០៤០២	ចុងផាន មាប៉ៃ	ពូជ្រៃ	
	១១០៤០៣	ពូគ្រែង ពូរ៉ាដេត	ស្រែអំពូម	
	១១០៤០១	ក្រាំងតេះ លូរ៉ាប៉េត ត្រាំកាច់	ក្រង់តេះ	

	១១០២០៥	ស្រែហ៊ុយ	ស្រែហ៊ុយ	កោះញែក
	១១០២០៦	ចំរើន សេរីមានរិទ្ធ សេរីមានរិទ្ធ សេរីមង្គល សេរីរ័ត្ន ក្បាលកោះ ក្បាលជ្រោយ ជ័យ វង្សី	ស្រែសង្គម	
	១១០២០២	អន្ទ្រេះ អរប្បូនលើ ទួល	អ ប្បូនលើ	
	១១០២០១	ពាមជីម្លៀត ណងប្បូរ	ណងឃីលិក	
	១១០២០៣	មេមុំ រយ៉	រយ៉	
	១១០២០៤	ជីក្លបលើ ស្រែធំ ក្លងទ្បៃ	សុខសាន្ត	
៥	**ព្រះវិហារ**			
	១៣០៧០៣	បាក់កាំ សេដ្ឋកិច្ច	ឈានមុខ	ត្បែងមានជ័យ
	១៣០៤០៣	ពង្រ ដាន ដំណាក់កន្ទួត ត្រាវគៀត ស្ទឹងសែនមនោរម្យ	ថ្មី	គូលែន
	១៣០៤០២	ព្យូរជ្រូក ពៀររាំង	គូលែនជើង	
	១៣០៤០១	គូលែនត្បូង ក្របៅ	គូលែនត្បូង	
	១៣០៤០៤	បុស្ស ញ៉ៅ ស្របាល	ភ្នំពេញ	
	១៣០៦០១	ដារ សែនគង់ ត្បែង ប្រធាតុ ស្រីស្រណោះ	ចំរើន	សង្គមថ្មី
	១៣០៦០៤	ស្ដៅ ត្រពាំងឆ្លក សុច តាបស	ស្ដៅ	
	១៣០៦០៣	សំឡាញ	ភ្នំត្បែងមួយ	
	១៣០៦០២	អណ្ដូងភ្លូ ក្ដី ស្ទឹង ខ្នុរ	រអាង	
	១៣០៦០៥	ត្រពាំងរាំង ត្រសេង ស្វាយ	រណសិរ្ស	
៦	**ពោធិ៍សាត់**			
	១៥០៥០២	ដងរុង ដំរីស គៀន អំពិលកញ្រ្ជិញ អន្លង់ហាប	កោះជុំ	កណ្ដៀង
	១៥០៤០៥	វាលវង់	រកាត	ភ្នំក្រវាញ
	១៥០៤០៦	ក្បេត្របូរី	សន្ទ្រែ	

	១៥០៤០៧	ព្រែក២ អូរហេង សំរោង១ សំរោង២ វាល	សំរោង	
	១៥០៣០៤	បំណក់ ចាមចាស់ ឈើទេព ទៀនព្រៃ ក្បាលទាហាន កណ្តាល ផ្ទះចេក	ឈើតុំ	ក្រគរ
	១៥០៣១១	ឈើទាល	ត្នោតជុំ	
	១៥០៣១០	បឹងស្នុក អន្សាចំបក់ កំរែង ត្រពាំងឈ្នួល	ស្វាយស	
	១៥០៦០៣	ចំការជ្រៃខាងជើង ចំការជ្រៃខាងត្បូង ដីក្រហម កណ្តាល ក្រាំងរងៀង	អន្លង់រាប	វាលវែង
	១៥០៦០១	គៀនជង្រុក អូរសោម ឆាយលោក	អូរសោម	
	១៥០៦០៤	ប្រមោយ ស្ទឹងថ្មី ទំពរ	ប្រមោយ	
៧	**រតនៈគីរី**			
	១៦០៧០៣	ប៉ក់ពរ ប៉ក់ធំ ប៉ក់តូច ឡំ	ប៉ក់ញ៉ៃ	អូរយ៉ាដាវ
	១៦០៧០១	កុកព្នង តាកុកប្រាយ	បរខាំ	
	១៦០៥០៥	ប៉ាតាង ព្រួក	បាតាង	លំផាត់
	១៦០៥០១	ដីឡូ ស្រែឈូក ថ្មី អូរកាន លំផាត សាមខា	ជ័យឧត្តម	
	១៦០៥០៣	កាឡុង កាំផ្លិញ កាទឹង	ល្បាំង១	
	១៦០៥០៤	កាចាញ កាទៀង	ល្បាំង២	
៨	**សៀមរាប**			
	១៧០២០៣	ដងរុង ពាក់ស្នែងថ្មី ជប់សោម ត្រពាំងទូក សណ្តាន់ ខ្ទីង	ពាក់ស្នែង	អង្គរធំ
	១៧០២០១	ពងទឹក ជប់ ប្រាសាទ ត្រពាំងទូក ទ័ពស្វាយ	ជប់តាត្រាវ	
	១៧០២០២	បំពេញរាជ្យ ដូនឳ ភ្លង់ ត្រពាំងស្វាយ សំរោង តាប្រុក	លាងដៃ	
	១៧០២០៤	បុស្សតាត្រាវ គោកកក់ កណ្តាល ព្រះគោ ស្វាយចេក តាត្រាវ	ស្វាយចេក	
	១៧១៤០៣	បីដុត ដៃអាវ គោកវត្ត ព្រៃខ្នុល ស្រែពោធិ៍ សែនជ័យ អូររំចេក ល្វា ត្រពាំងក្រសាំង សមុទ្រ វត្ត ខ្នារផ្ទោល	ស្រែណូយ	វ៉ារិន
	១៧១៤០២	គោកចាន់ គោកកណ្តាល អូរទៃ	ល្វាក្រាំង	

	១៧១៤០១	វៀន កាប់ដៃ កញ្ជន់រុន ប្រាសាទ ទំនាបស្វាយ	ប្រាសាទ	
	១៧១៤០៤	ឬស្សីធំ ចារ អូរ កំបោរ ស្វាយស	ស្វាយស	
	១៧១៤០៥	ចាន់រុន គោកគ្រួស គោកស្រុក រដ្ឋល វ៉ារិន	វ៉ារិន	

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦

ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះ ក្រោមគម្រោងអគ្គិសនីការូបនីយកម្មជនបទ និងខ្សែបញ្ជូន រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

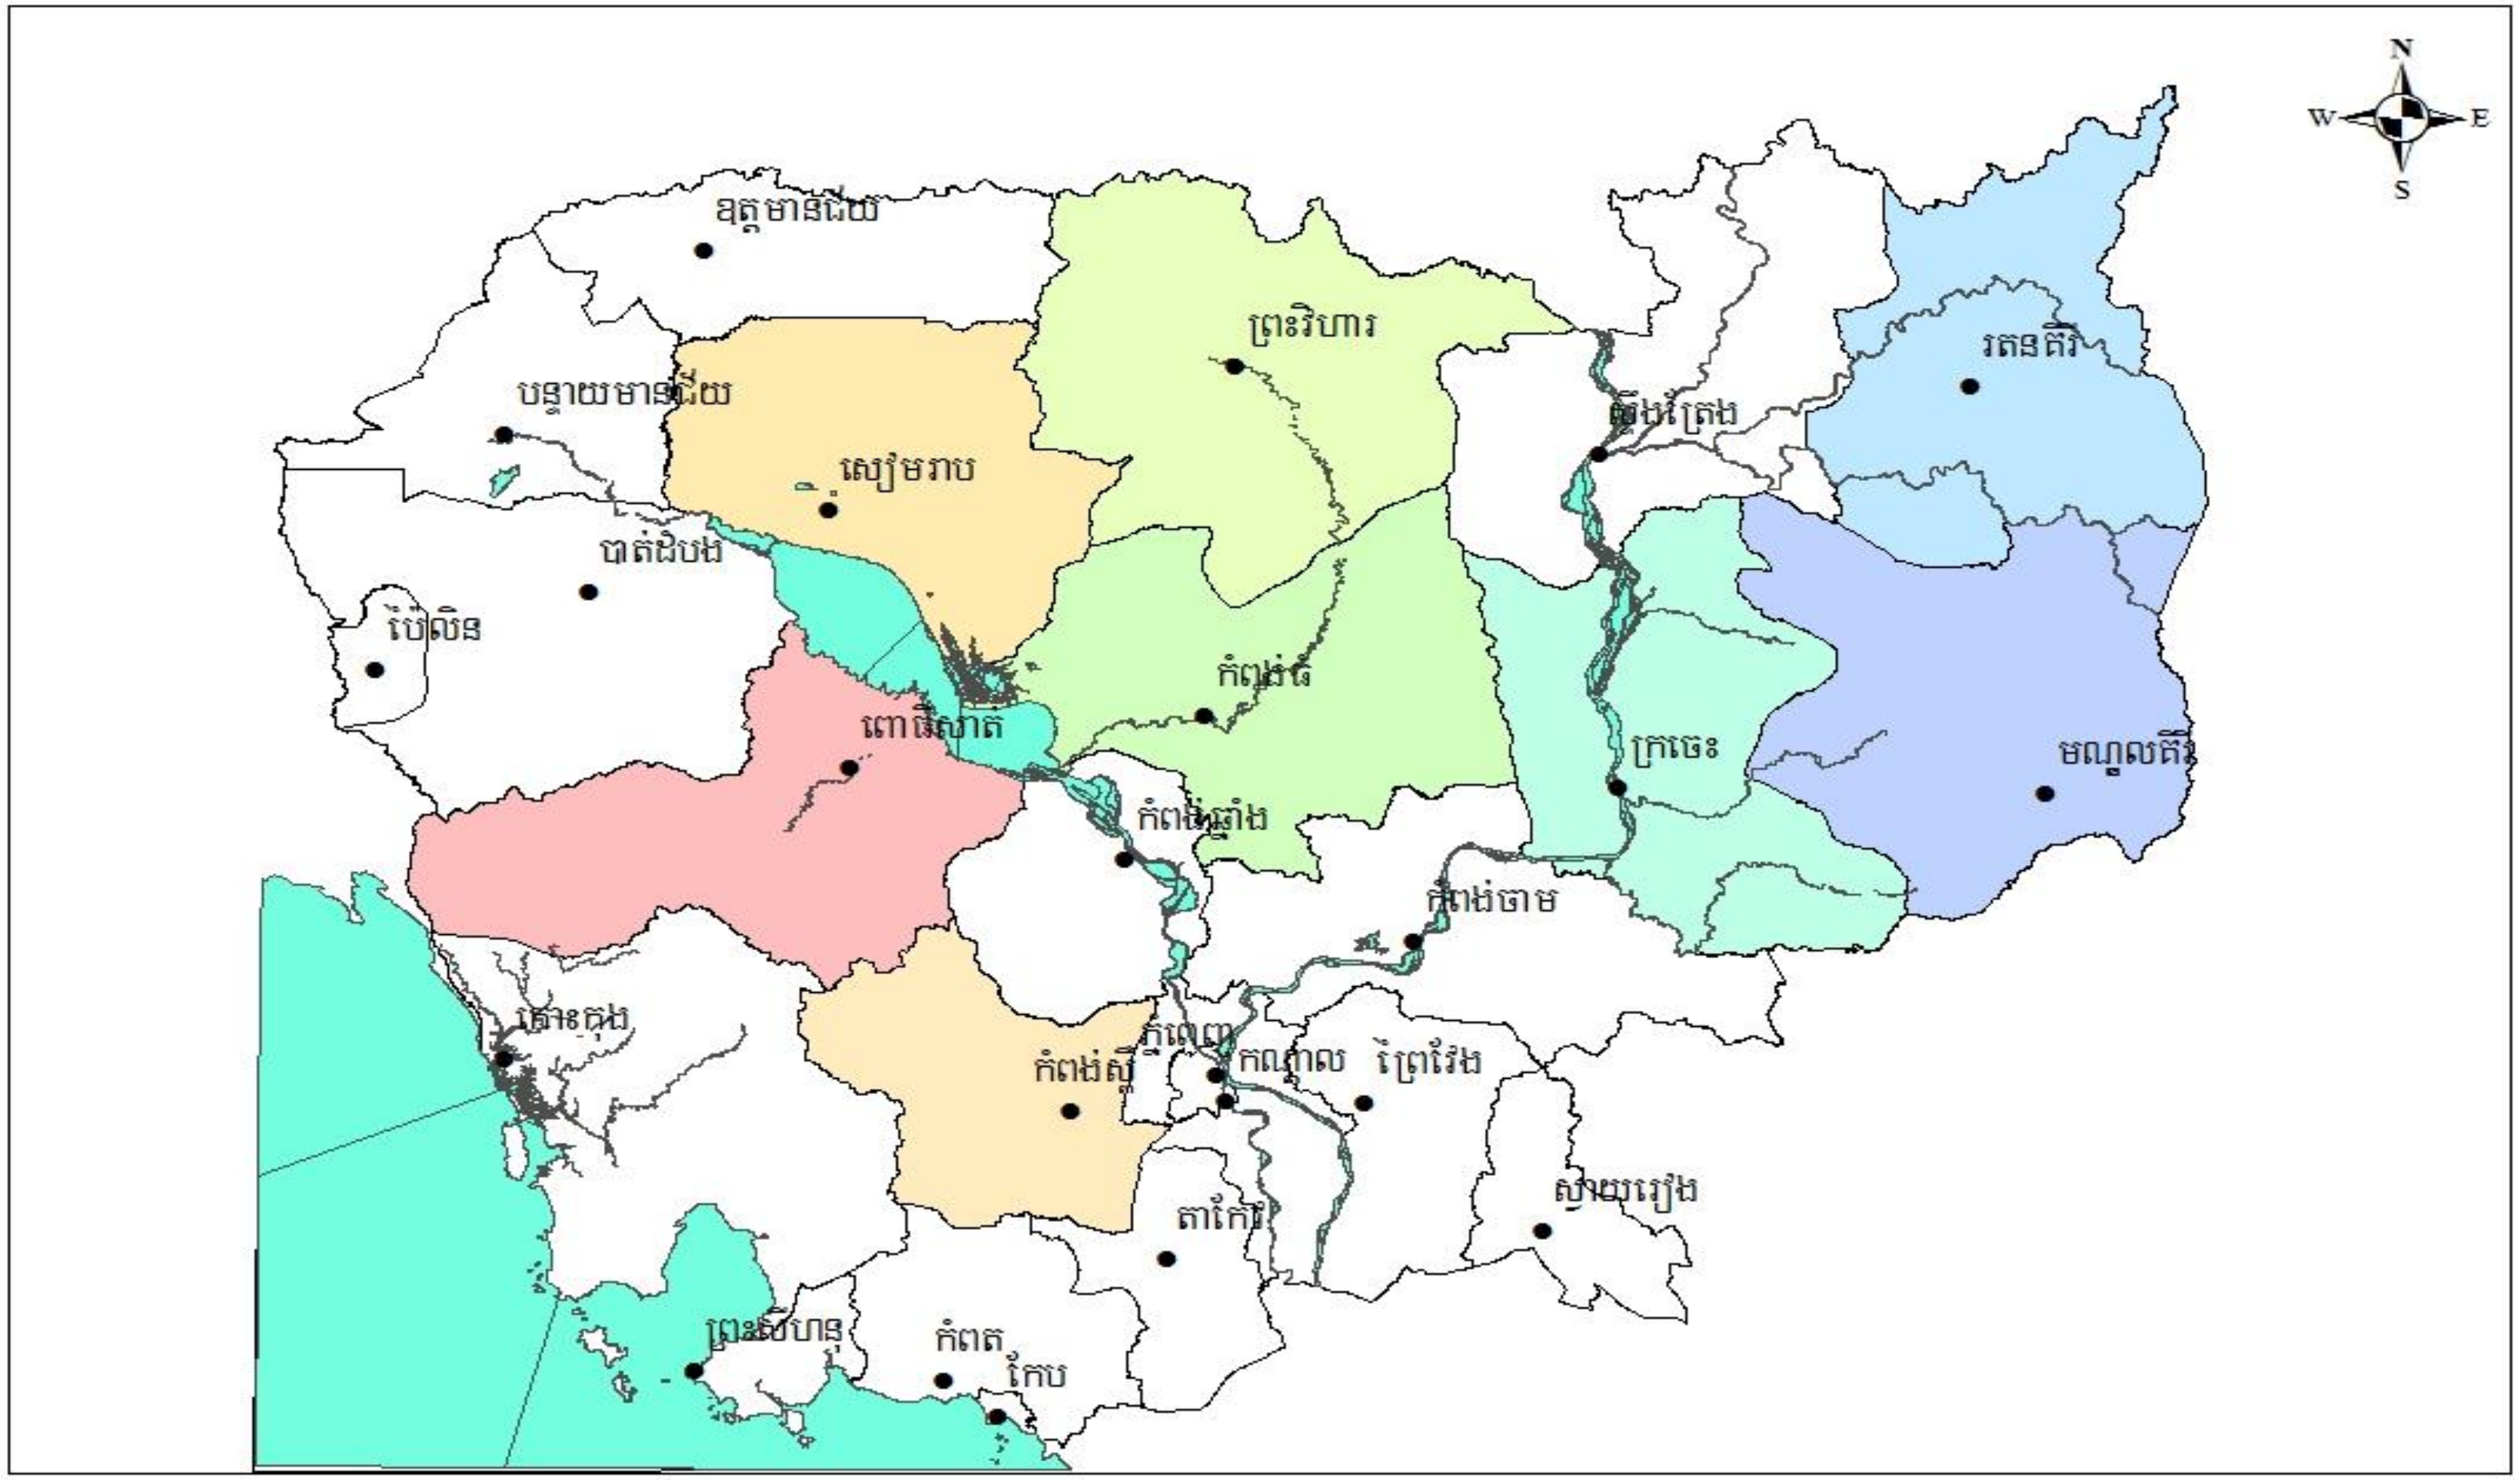

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧

ព័ត៌មានស្តីពីអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយម.អ.ជ.ដើម្បីទទួលថវិកាជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ

តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ខេត្ត/ក្រុង	តំបន់ធ្វើសេវាកម្ម	លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ	ឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ	ភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធបណ្តាញ
បន្ទាយមានជ័យ	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំភ្នំតូច ឃុំចំណោម ឃុំសឿ និងឃុំអូរប្រាសាទ ស្រុកមង្គលបូរី	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	តាមដងផ្លូវលេខ៥៦ ពីសេរីសោភ័ណ្ឌទៅបឹងត្រកួន ឃុំគោករមាត ស្រុកថ្មពួក	១៨៩អ	ក្រុមហ៊ុនភូមិនិមិត្ត	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបត់ត្រង់ ឃុំហោត់ទឹក ឃុំចំណោម និងឃុំសឿ ស្រុកមង្គលបូរី	៣២៤អ	លោកស្រី ខៀវ សុខា	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
បាត់ដំបង	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបឹងព្រីង ស្រុកថ្មគោល	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំព្រៃស្វាយ ឃុំឫស្សីក្រាំង ឃុំតាគារ ឃុំរបស់មង្គល ស្រុកមោងឫស្សី	៣០៣អ	លោកស្រី លិម វណ្ណា	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ឃុំតាម៉ឺន និងឃុំជ្រោយស្តៅ ស្រុកថ្មគោល	២០១អ	លោក អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
កំពង់ឆ្នាំង	ឃុំពន្លៃ ឃុំចក និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំពពេល និងឃុំខុនរ៉ង ស្រុកបរិបូរណ៍	០៤០អ	លោក ម៉ក់ ហ៊ាត	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	បញ្ជូនសម្រាប់គោលបំណងពិសេស និងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មចែកចាយ	៣០០អ	ក្រុមហ៊ុន អូ.អេស.វី.អ. គ្រេឌីង	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
កំពង់ស្ពឺ	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច	០៨២អ	លោក លី សុខគ្រី	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃស្រុកគងពិសី ស្រុកសំរោងទង ស្រុកបសេដ្ឋ និងស្រុកភ្នំស្រួច	២២៤អ	ក្រុមហ៊ុនសុខាអេឡិកទ្រីស៊ីធី	ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាតិ

កំពត	ផ្នែកខ្លះនៃស្រុកបន្ទាយមាស ស្រុកកំពង់ត្រាច និងស្រុកអង្គរជ័យ	០៩៣អ	សហគ្រាសអគ្គិសនីទូកមាស	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
កណ្ដាល	ឃុំកំពង់ចម្លង ឃុំស៊ីធរ និងឃុំជ្រៃធំ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល	០៤៥អ	លោកស្រី ជួប នាង	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ឃុំស្វាយប្រទាល ឃុំត្រើយស្លា ឃុំតាលន់ ឃុំខ្ពប ឃុំប្រាសាទ ស្រុកស្អាង ឃុំពោធិ៍បាន ឃុំកំពង់កុង ឃុំជ្រោយតាកែវ ឃុំឈើខ្មៅ ឃុំព្រែកជ្រៃ និងឃុំលើកដែក ស្រុកកោះធំ	០៤៩អ	សហគ្រាស EAPOSE	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
កោះកុង	ឃុំបឹងព្រាវ ស្រុកស្រែអំបិល	៣៥៨អ	លោក អ៊ួច ង៉ាក់	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
ក្រចេះ	ឃុំកន្ទួត ផ្នែកខ្លះនៃឃុំថ្មអណ្ដើក ឃុំជា ឃុំបុស្សលាវ ស្រុកចិតបូរី ឃុំក្សេម និងឃុំស្វាយជ្រះ ស្រុកស្នួល	៣៤២អ	ក្រុមហ៊ុនយានសុភរិទ្ធ ត្រេឌីង	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
ព្រៃវែង	តំបន់ស្រុកពារាំង	០៤៥អ	លោកស្រី ជួប នាង	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ឃុំរកា ឃុំព្រៃស្រឡៅត ឃុំព្រៃញ្ញៅ និងឃុំព្រៃស្នៀត ស្រុកពារាំង	២៩៤ អ	លោកស្រី ឆេង គឹមហៀក	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
ពោធិ៍សាត់	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបឹងខ្នារ ឃុំខ្នារទទឹង និងឃុំមេទឹក ស្រុកបាកាន	០៣៣អ	លោក ឈួ ងួន	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃស្រុកវាលវែង	៣០៣អ	លោកស្រី លិម វណ្ណា	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ឃុំបឹងកន្ទួត ឃុំត្នោតជុំ ឃុំអូរសណ្ដាន់ ឃុំស្នាអន្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត ឃុំក្បាលត្រាច និងឃុំអន្សាចំបក់ ស្រុកក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សារង្ស	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
ព្រះសីហនុ	ឃុំព្រៃនប់ ឃុំទួលទទឹង ឃុំអណ្ដូងថ្ម និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំអូរឧកញ៉ាហេង និងឃុំបឹងតាព្រហ្ម ស្រុកព្រៃនប់	១៨៤អ	លោកស្រី ជា គឹមថាត	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញកំពត-ព្រះសីហនុ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំបឹងព្រាវ ឃុំស្ទឹងឆាយ ស្រុកកំពង់សីលា ឃុំជើងគោ ស្រុកព្រៃនប់ និងឃុំជ្រោយស្វាយ ស្រុកស្ទឹងហាវ	៣០៤អ	ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឬទ្ធី គ្រុប	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំចំការហ្លួង និងឃុំស្ទឹងឆាយ ស្រុកកំពង់សីលា	៣៥៨អ	លោក អ៊ួច ង៉ាក់	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ

តាកែវ	ទីប្រជុំជនផ្សារសំរោងយ៉ោង ឃុំត្រពាំងសាប ឃុំចំប៉ី ឃុំកណ្ដឹង ឃុំពារាម ស្រុកបាទី	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធី សំរោងយ៉ោង	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ឃុំគោកពោធិ៍ ឃុំដូងខ្ពស់ និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំបូរីជលសារ ស្រុកបូរីជលសារ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំគោកធ្លក ស្រុកអង្គរបុរី និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំអង្គាញ់ ស្រុកទ្រាំង	០២២អ	លោក គង់ ផាត	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម
	ឃុំព្រៃផ្ដៅ ផ្នែកខ្លះនៃឃុំតាំងយ៉ាប ឃុំចម្ប៉ា ឃុំក្លាញ់ និងឃុំកំពែង ស្រុកព្រៃកប្បាស និងឃុំពន្លៃ ស្រុកអង្គបុរី	០៥៤អ	លោកស្រី អ៊ួច ប៉ោ	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃស្រុកគីរីវង់	០៩៣អ	សហគ្រាសអគ្គិសនីទូកមាស	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញតង់ស្យុងមធ្យមពីប្រទេសវៀតណាម និង ប្រព័ន្ធ បណ្ដាញជាតិ
	ឃុំព្រៃកផ្ទោល ឃុំអង្គរបុរី និងទីរួមស្រុកអង្គបុរី	១១៣អ	លោក នូ គ្រុយ	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ
	ផ្នែកខ្លះនៃឃុំឧត្ដមសុរិយា ស្រុកត្រាំកក់ ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងត្បូង ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង ឃុំសំរោង ឃុំជម្រះពេន ឃុំសឹង្ហ និងផ្នែកខ្លះនៃឃុំលំចង់ ស្រុកសំរោង	១៨៨អ	លោក លឹម ស៊ីសុភ័ណ្ឌ	ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៨

ព័ត៌មានសង្ខេបស្ដីពីប្រវែងខ្សែបណ្ដាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា ប្រវែងខ្សែបណ្ដាញបានសាងសង់រួច និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ តាមខេត្តនីមួយៗ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ខេត្ត/ក្រុង	អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ	ឈ្មោះអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ	ប្រវែងខ្សែបណ្ដាញគោលដៅគ្រោងសាងសង់ជាប់កិច្ចសន្យា (km)	ប្រវែងខ្សែបណ្ដាញបានសាងសង់រួច (km)	សំគាល់
បន្ទាយមានជ័យ	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន	6	6	បានទទួលថវិកាជួយទុន
	១៨៩អ	ក្រុមហ៊ុនភូមិនិមិត្ត	20	0	កំពុងសាងសង់
	៣២៤អ	លោកស្រី ខៀវ សុខា	8	0	កំពុងសាងសង់
បាត់ដំបង	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន	0	0	-
	៣០៣អ	លោកស្រី លិម វណ្ណា	19	19	បានទទួលថវិកាជួយទុន
	២០១អ	លោក អ៊ូ ចាន់រ័ត្ន	4.5	0	កំពុងសាងសង់
កំពង់ឆ្នាំង	០៤០អ	លោក ម៉ក់ ហ៊ាត	6	0	កំពុងសាងសង់
	៣០០អ	ក្រុមហ៊ុន អូ.អេស.វី.អ.ត្រេឌីង	22	22	បានទទួលថវិកាជួយទុន
កំពង់ស្ពឺ	០៨២អ	លោក លី សុខគ្រី	8	0	កំពុងសាងសង់
	២២៤អ	ក្រុមហ៊ុនសុខាអេឡិកទ្រីស៊ីធី	10	0	កំពុងសាងសង់
កំពត	០៩៣អ	សហគ្រាសអគ្គិសនីទូកមាស	12	0	កំពុងសាងសង់
កណ្ដាល	០៤៥អ	លោកស្រី ជួប នាង	7	0	កំពុងសាងសង់
	០៤៩អ	សហគ្រាស EAPOSE	12.7	0	កំពុងសាងសង់
កោះកុង	៣៥៨អ	លោក អ៊ួច ង៉ាក់	6.45	6.45	បានទទួលថវិកាជួយទុន
ក្រចេះ	៣៤២អ	ក្រុមហ៊ុនឃោនសុភរិទ្ធ ត្រេឌីង	8	0	កំពុងសាងសង់

ព្រៃវែង	០៤៥អ	លោកស្រី ជួប នាង	0	0	-
	២៩៤ អ	លោកស្រី ឆេង គឹមហៀក	6.63	0	-
ពោធិ៍សាត់	០៣៣អ	លោក ឈួ ងួន	16.4	10.92	បានទទួលថវិកាជួយទុន
	៣០៣អ	លោកស្រី លិម វណ្ណា	0	0	-
	១២៥អ	លោក យក់ សារង្ស	11	0	កំពុងសាងសង់
ព្រះសីហនុ	១៨៤អ	លោកស្រី ដា គឹមថាត	5	0	កំពុងសាងសង់
	៣០៤អ	ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប	16.5	0	កំពុងសាងសង់
	៣៥៨អ	លោក អ៊ូច ង៉ាក់	0	0	-
តាកែវ	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធីសំរោងយ៉ោង	6	6	បានទទួលថវិកាជួយទុន
	០២២អ	លោក គង់ ផាត	6	0	កំពុងសាងសង់
	០៥៤អ	លោកស្រី អ៊ូច ប៉ោ	4	0	កំពុងសាងសង់
	០៩៣អ	សហគ្រាសអគ្គិសនីទូកមាស	0	0	កំពុងសាងសង់
	១១៣អ	លោក នូ គ្រុយ	16	0	កំពុងសាងសង់
	១៨៨អ	លោក លឹម ស៊ីសុក័ណ្ឌ	8	8	បានទទួលថវិកាជួយទុន
		សរុប	**245.18**	**78.37**	

ឧបសម្ព័ន្ធទី៩

បញ្ជីឈ្មោះភូមិដែលគ្របដណ្តប់ក្រោមកម្មវិធីជួយទុនសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣

ល.រ	លេខកូដឃុំ	ឈ្មោះភូមិ	ឈ្មោះឃុំ	ឈ្មោះស្រុក	លេខអាជ្ញាប័ណ្ណ	អ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ
១	**បន្ទាយមានជ័យ**					
	១០២១១	ដំណាក់ថ្ម	ឃុំសឿ	មង្គលបូរី	០៧៩អ	លោក ធន់ ធឿន
	១០២០៣	ស្រែព្រៃ តាប៊ុន	ឃុំចំណោម			
២	**បាត់ដំបង**					
	២០៦១១	សៀម ឆ្កែខាំប្រើស ព្រែកជីក	ឃុំព្រែកជីក	ស្រុករុក្ខគីរី	៣០៣អ	លោកស្រី លិម វណ្ណា
	២០៦១២	ព្រៃខ្ពូត ស្តុកប្រវឹក	ឃុំព្រៃត្រឡាច			
	២០៦០៣	ចាមរអារ គរ	ឃុំព្រៃស្វាយ	ស្រុកមោងឫស្សី		
	២០៦០៤	និគមក្រោម	ឃុំឫស្សីក្រាំង			
៣	**កំពង់ឆ្នាំង**					
	៤០៦០៣	ទឹកចេញ តាំងបំពង់ ព្រីងកោង លួង តាលោ អណ្តូងចេក	ឃុំជើងគ្រាវ	ស្រុករលៀប្អៀរ	៣០០អ	ក្រុមហ៊ុន អូ.អេស.វី.អ.ត្រេឌីង
	៤០៦០៩	ព្រៃមូល ព្រៃក្រោល តារ៉ាក់ ប្រចាក់	ឃុំព្រៃមូល			
	៤០៦០៤	អាឡែង	ឃុំជ្រៃបាក់			
	៦០៧០៨	ចំបក់កន្ទ្រាញ គោកពួក គោលណាំង ចាស់ តាំងក្រសាំង ក្រាំងតាមុំ	ឃុំតាំងក្រសាំង	ស្រុកទឹកផុស		
៤	**ព្រៃវែង**					
	១៤០៨០២	ថ្កូវ ព្រៃទំពូង	ឃុំកញ្ជំ	ស្រុកពារាំង	២៩៤អ	លោកស្រី ឆេង គឹមហៀក

៥	ពោធិ៍សាត់					
	១៥០១០៣	ផ្ទះស្លា ក្រូចសើច បាក់មែក តមោក ខ្នារទទឹង	ឃុំខ្នារទទឹង	ស្រុកបាកាន	០៣៣អ	លោក ឈូ ងួន
	១៥០១០៤	សំពោងព្រៃខៀវ	ឃុំមេទឹក			
	១៥០១០២	ព្រៃស្វាយ	ឃុំបឹងខ្នារ			
	១៥០៣០១	ថ្កោលធំ	ឃុំអន្លង់ត្នោត	ស្រុកក្រគរ	១២៥អ	លោក យក់ សារង្ស
៦	ព្រះសីហនុ					
	១៨០៤០៤	គីរីវ័ន្ត	ឃុំស្ទឹងឆាយ	ស្រុកកំពង់សិលា	៣៥៨អ	លោក អ៊ូច ង៉ាក់
	-	ចំការហ្លួង	ឃុំចំការហ្លួង			
៧	តាកែវ					
	២១០២១៥	ត្រពាំងទឹម ស្តុកប្រិយ ពួនភ្នំ ជំរៅ ស្មោខ្ចី	ឃុំត្រពាំងសាប	ស្រុកបាទី	០១៥អ	សហគ្រាសអេឡិកទ្រីស៊ីធី សំរោងយ៉ោង
	២១០៧០២	បឹងក្រាញ់	ឃុំបឹងក្រាញ់ខាងត្បូង	ស្រុកសំរោង	១៨៨អ	លោក លឹម ស៊ីសុភ័ណ្ឌ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១០
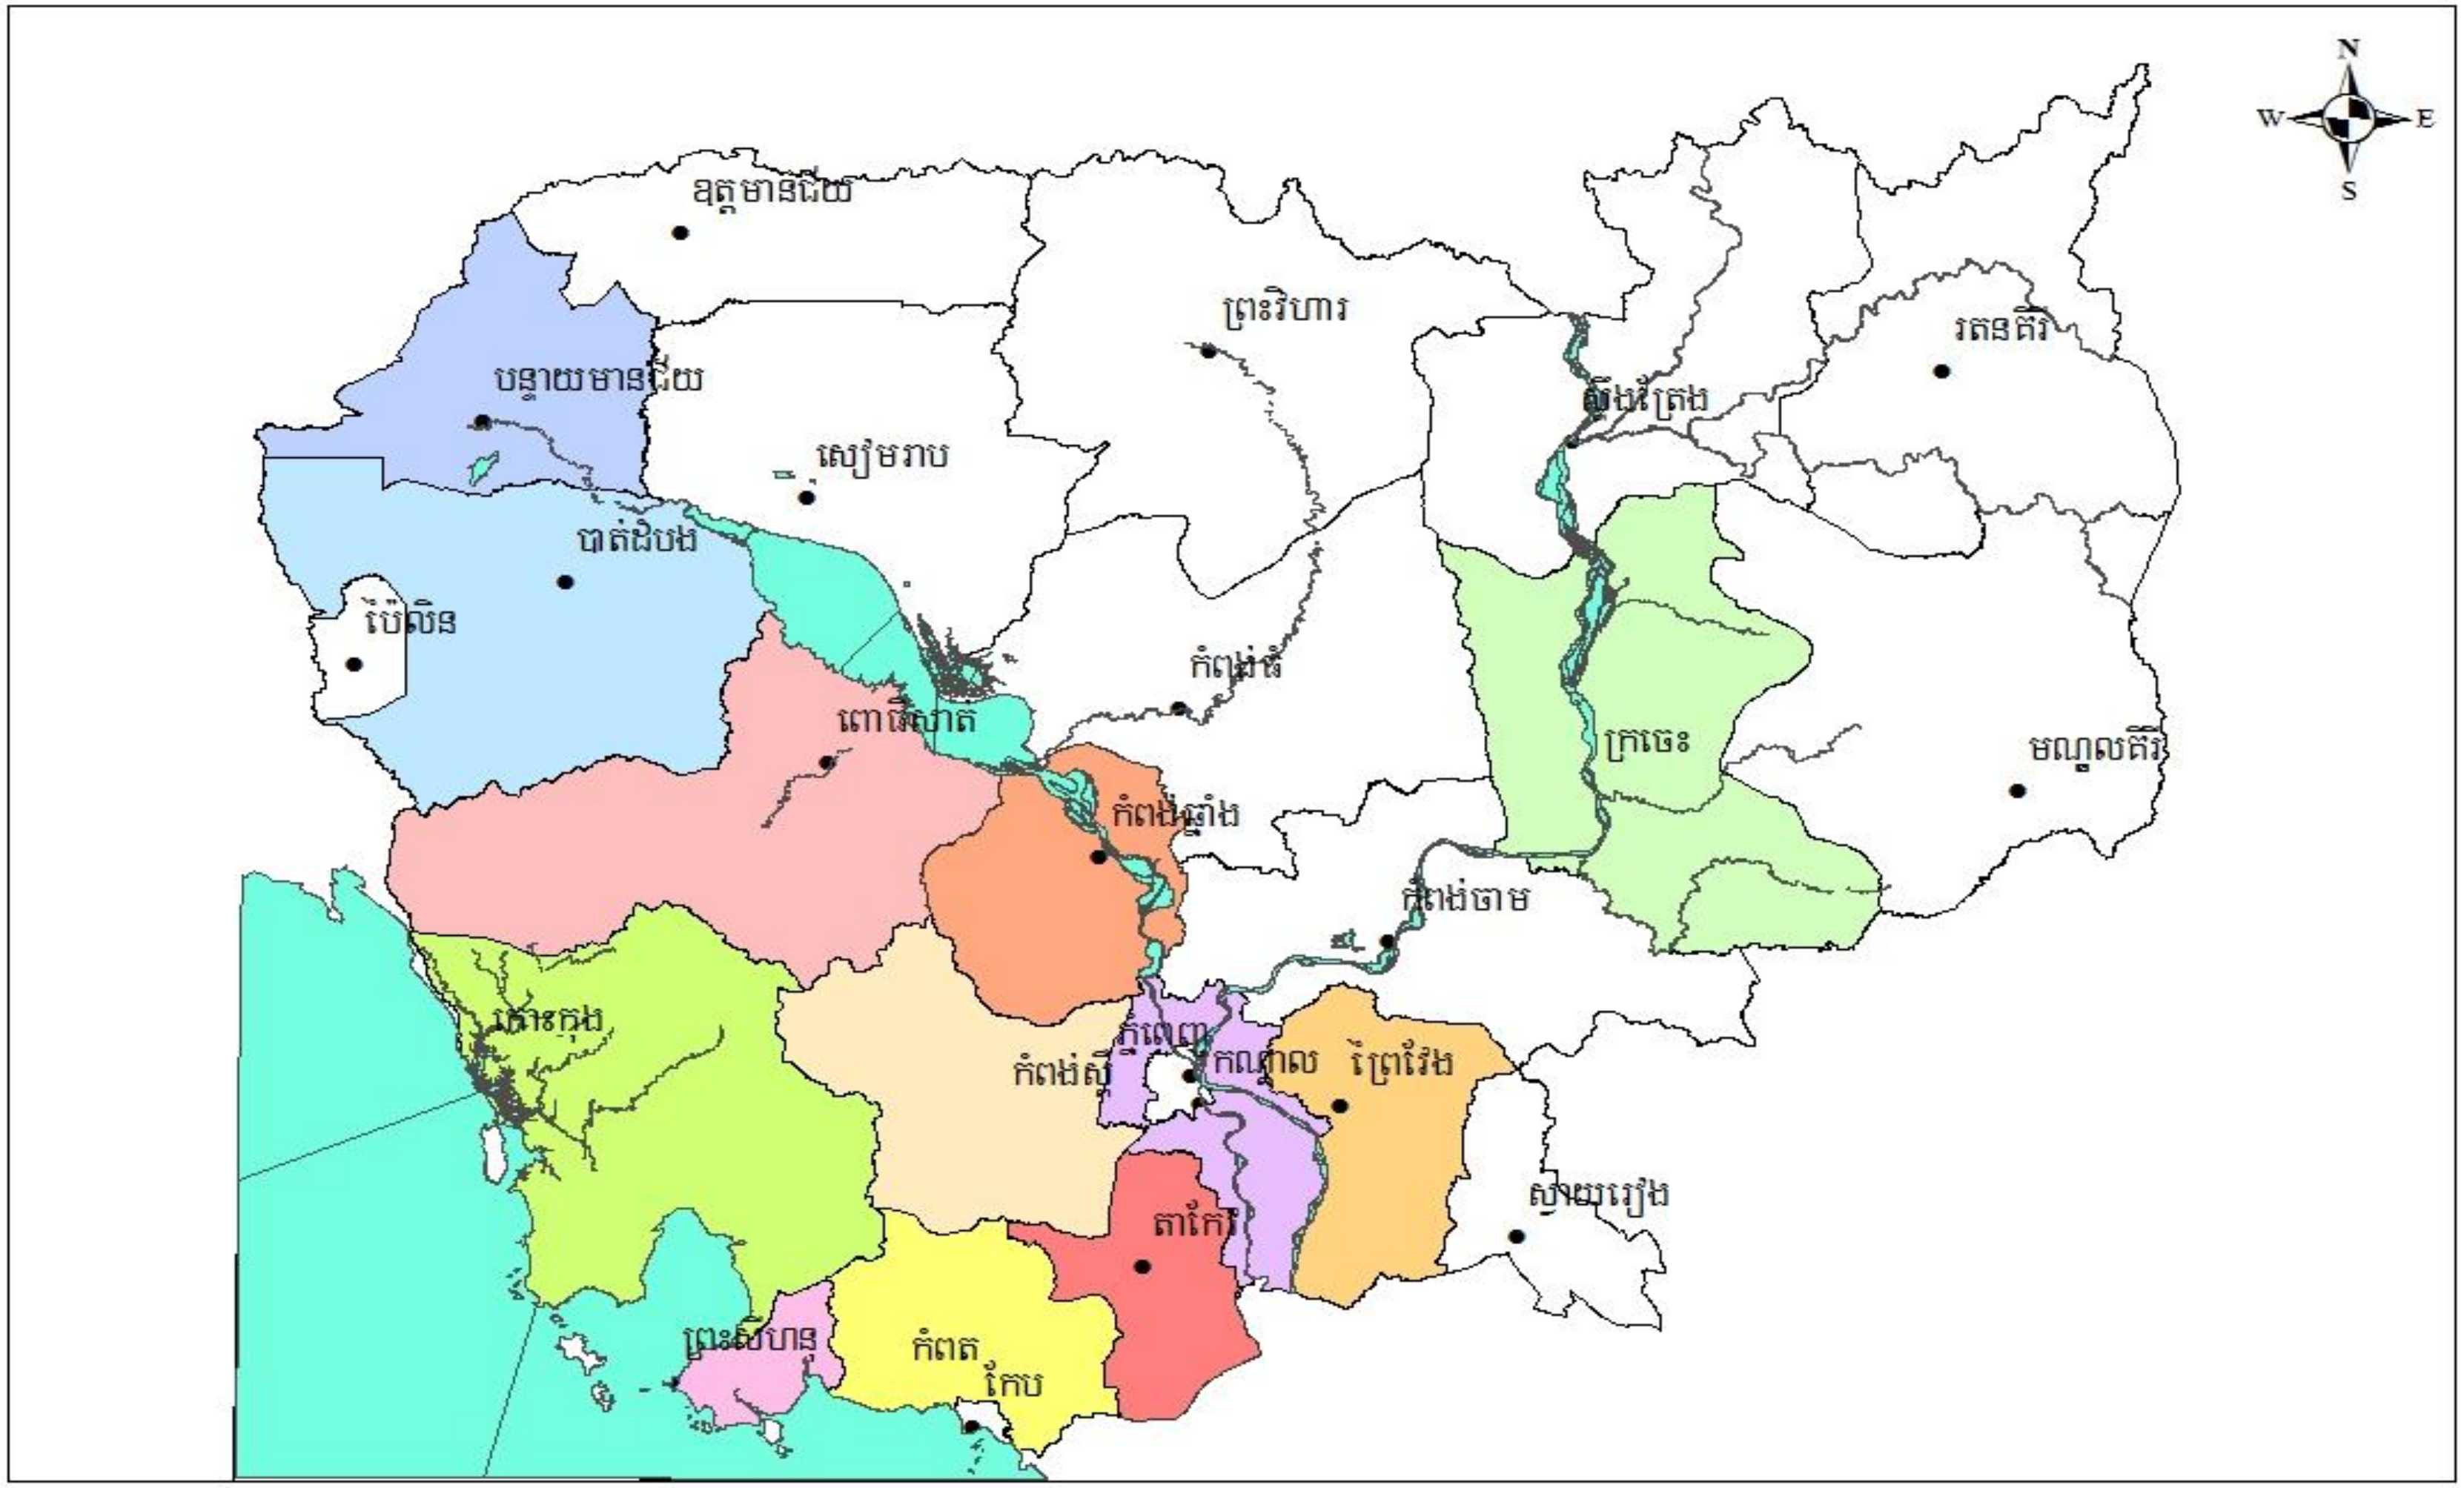
ផែនទីបង្ហាញពីខេត្តដែល ម.អ.ជ. បានផ្តល់ថវិកាទុនជួយសម្រាប់ពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
